


【黒崎地区海岸】進捗状況


事業概要

復旧延長 L=325.1m
護岸工(直立型) L=325.1m V=7,871m³

計画平面図

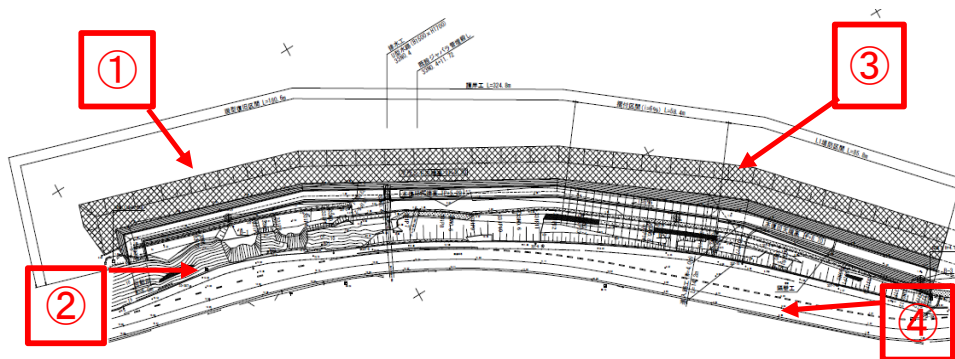

計画横断面図

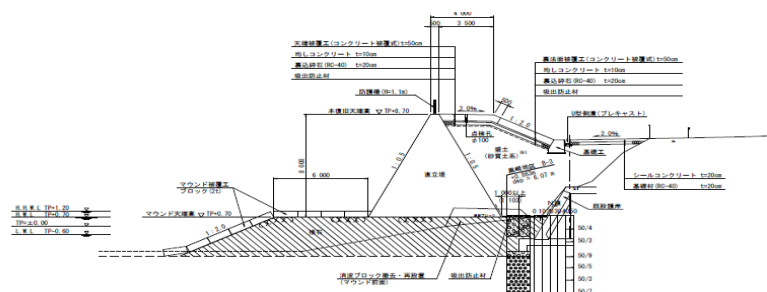

事業位置



黒崎地区海岸

南三陸町志津川字脇ノ沢

① 着手前 平成25年10月



② 着手前 平成25年10月



③ 着手前 平成25年10月



④ 着手前 平成25年10月



【黒崎地区海岸】進捗状況

進捗状況

現在の進捗状況は99%です。(先月は91%)
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



護岸擁壁工を整備中です

② 平成27年11月末現在の状況



護岸擁壁工を整備中です

③ 平成27年11月末現在の状況



護岸擁壁工整備中です

④ 平成27年11月末現在の状況



護岸擁壁工を整備中です
