


【大谷地区海岸】進捗状況

事業概要

復旧延長 L=564.5m 人工リーフ4基
 捨石工 50~200kg V=29,431m³
 海岸コンクリートブロック製作(8,10,12t) N= 2,043個
 既設被覆ブロック再設置(4,8t) N= 5,244個
 既設被覆ブロック撤去(2,4,8t) N= 7,765個

計画平面図

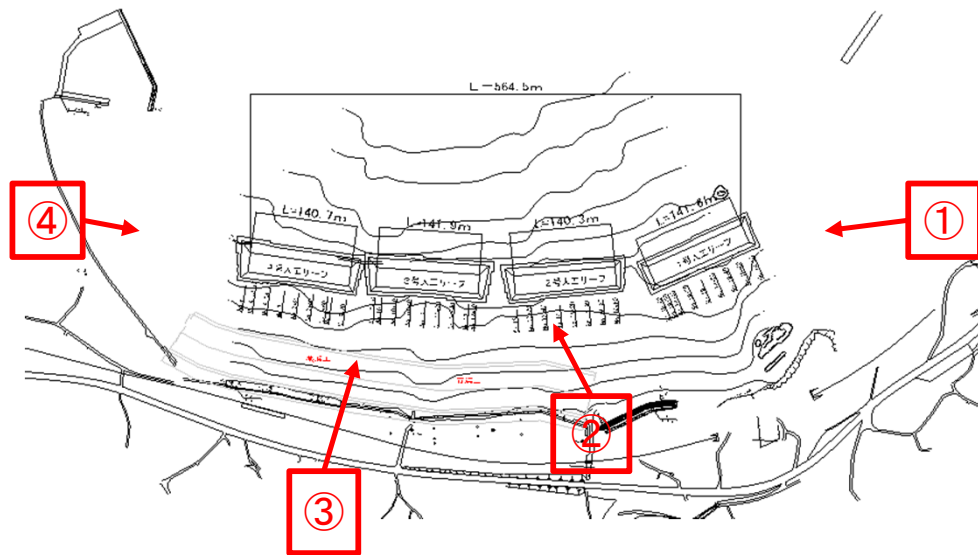

事業位置



大谷地区海岸
 気仙沼市本吉町大谷地先


① 着手前 平成26年3月



② 着手前 平成26年3月



計画横断図



③ 着手前 平成26年3月



④ 着手前 平成26年3月



【大谷地区海岸】 進捗状況

進捗状況

現在の進捗状況は **64.2%**です。（先月は60.4%）
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況 1号人工リーフ



現在、4tブロック再設置工を進めています。

② 平成27年11月末現在の状況 4号人工リーフ



現在、8t及び4tブロック撤去を進めています。

③ 平成27年11月末現在の状況 3号人工リーフ



現在、洗掘防止マット敷設を完了しました。

④ 平成27年11月末現在の状況 ブロック製作



平成27年9月末で全ブロック製作完了しました。
