

# 【荒谷前地区海岸】進捗状況

## 事業概要

本工事 施工延長 L=217.0m

堤体盛土 V=43,100m<sup>3</sup> 傾斜護岸 L=217.0m

階段工 N=1基 樋管工 N=1基

附帯工事

付替道路 L=86.0m 下水道敷設換え L=30.0m


取付道路工 L=90.95m

## 事業位置




荒谷前地区海岸  
気仙沼市唐桑町荒谷前地先

## 計画平面図

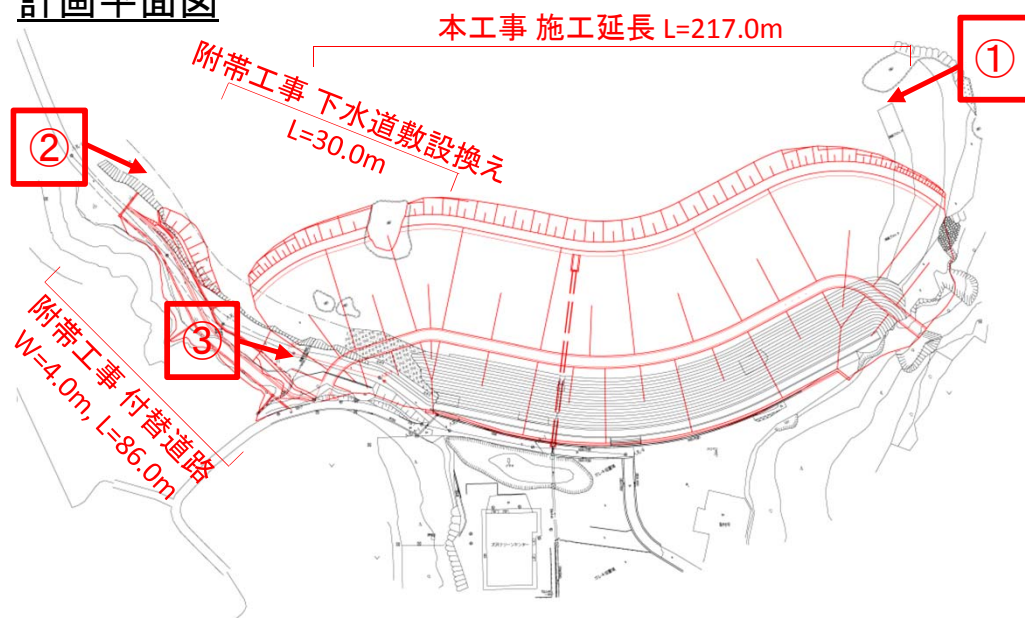

## 計画横断図

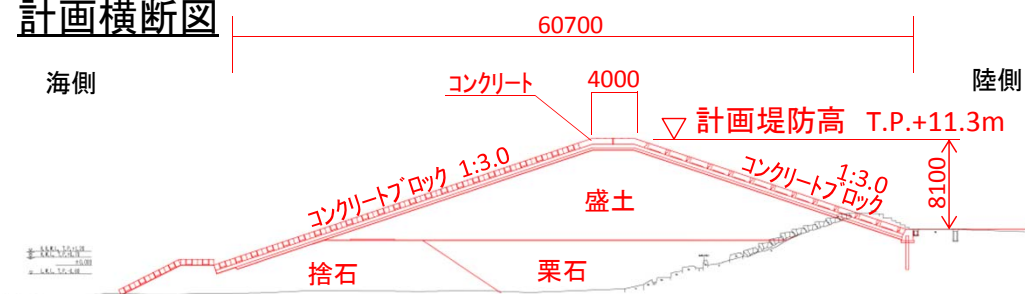

① 着手前 平成25年10月



② 着手前 平成25年10月



③ 着手前 平成25年10月



④ 着手前 平成25年10月



# 【荒谷前地区海岸】 進捗状況

## 進捗状況

完成は平成27年12月中旬を予定しています。  
進捗率は、99.72%です。

### ① 平成27年11月末現在の状況



表法面被覆工は  
完了しました。

### ② 平成27年11月末現在の状況



海上から全景

### ③ 平成27年11月末現在の状況



裏法面被覆工、  
天端工は完了し  
ました。

現在は付替道路工(舗装工)及び取付道路工の工事を  
しております。
