

【亀山磯草地先海岸】進捗状況

事業概要

復旧延長 L=338.1m

混成堤工等 L=338.1m

コンクリート量 V=1087m³

方塊ブロック製作・据付 N=146m²

捨石(40~200kg/個) V=7264m³ 被覆石 V=4458m³

排水工 一式


事業位置




亀山磯草地先海岸

気仙沼市亀山地先

計画平面図

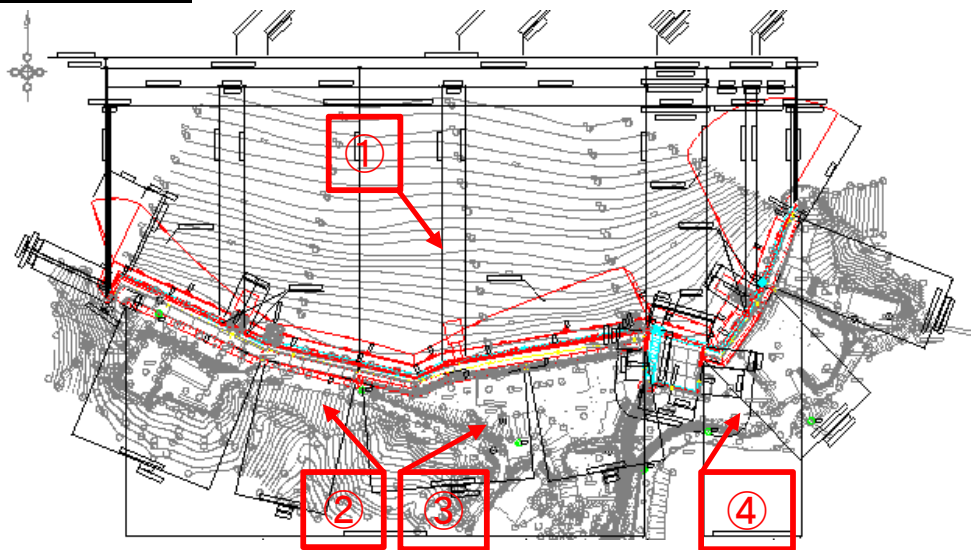

計画横断図

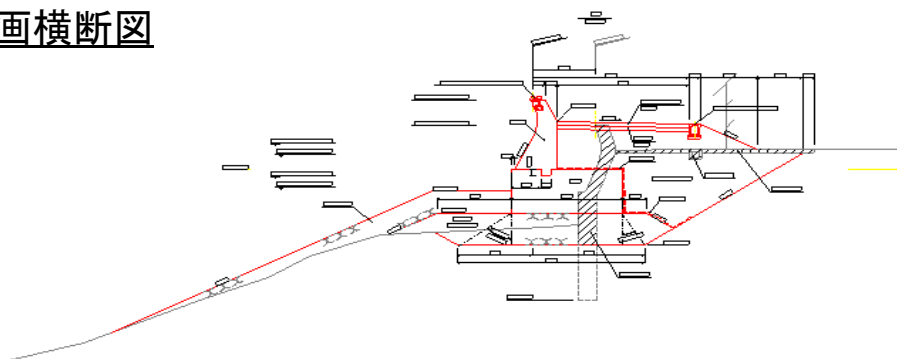

① 着手前 平成26年12月



② 着手前 平成26年12月



③ 着手前 平成26年12月



④ 着手前 平成26年12月



【亀山磯草地先海岸】進捗状況

進捗状況

現在、既設護岸の撤去工を進めております。
完成は平成28年12月28日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



現在、裏埋工の掘削を進めています。

② 平成27年11月末現在の状況



現在、裏埋工の掘削を進めています。

③ 平成27年11月末現在の状況



現在、裏埋工の掘削を進めています。

④ 平成27年11月末現在の状況



現在、裏埋工の残土仮置きを進めています。


【大島地区海岸 亀山磯草地先海岸1】進捗状況

事業概要


復旧延長 L=350.4m

混成堤工L=170.1m,直立堤工L=163.6m,
荷捌き工L=100.6m,斜路工L=30.0m

計画平面図

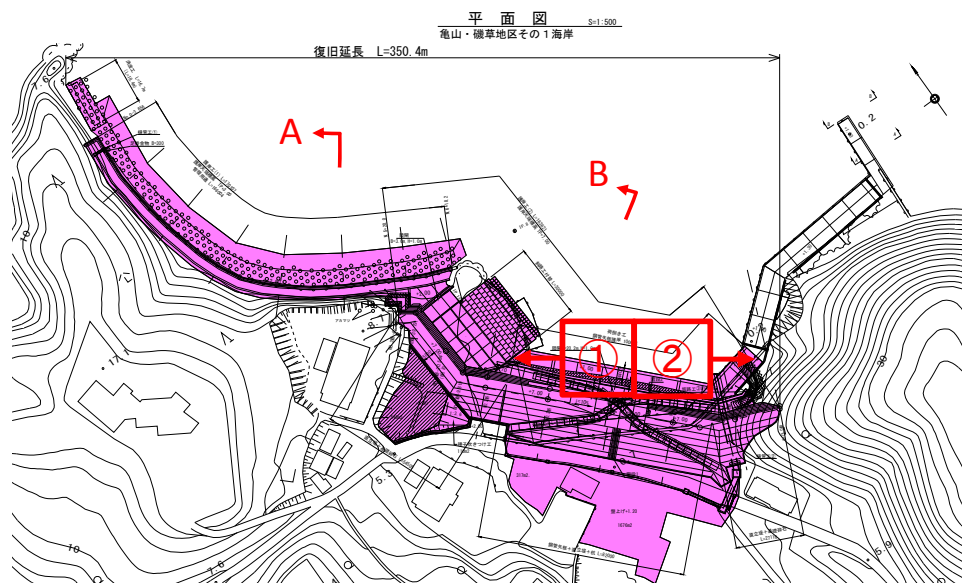

計画横断図

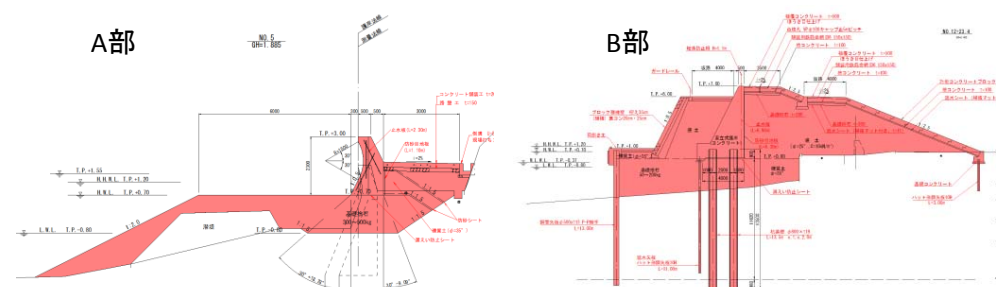

事業位置



気仙沼海岸 大島地区海岸
亀山磯草地先海岸
気仙沼市外浜地先

① 着手前 平成27年5月

起点側(西側)



② 着手前 平成27年5月

終点側(東側)



【大島地区海岸 亀山磯草地先海岸1】 進捗状況

進捗状況

工事着手に向けた測量・調査を進めています。

① 平成27年11月末現在の状況



現在，測量・調査を進めています。

② 平成27年11月末現在の状況



現在，測量・調査を進めています。


【大島地区海岸 亀山磯草地先海岸2】 進捗状況

事業概要

復旧延長 L=111.1m

重力式護岸工L=111.1m,
荷捌き工L=71.1m

計画平面図

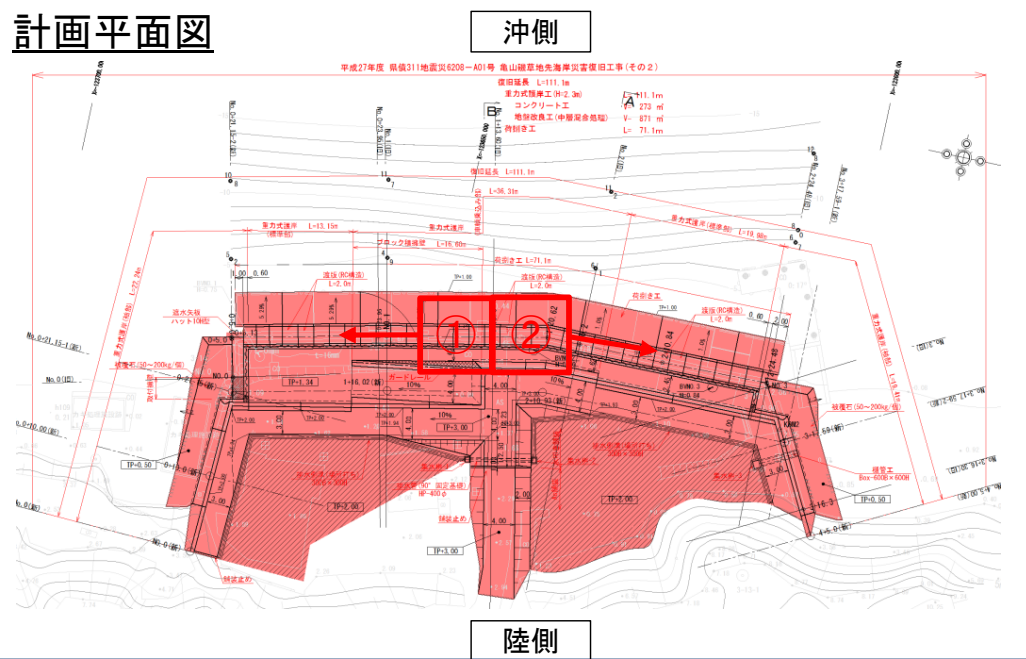

事業位置




気仙沼海岸 大島地区海岸
亀山磯草地先海岸
気仙沼市外浜地先

① 着手前 平成27年5月

起点側(南側)



計画横断図

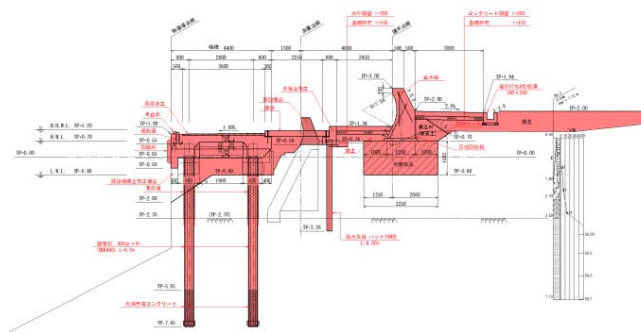

② 着手前 平成27年5月

終点側(北側)



【大島地区海岸 亀山磯草地先海岸2】 進捗状況

進捗状況

工事着手に向けた測量・調査を進めています。

① 平成27年11月末現在の状況



現在，測量・調査を進めています。

② 平成27年11月末現在の状況



現在，測量・調査を進めています。
