


【高井浜大向地先海岸】進捗状況

事業概要


本工事 施工延長 L=659.6m
直立堤工(H=3.8~6.3m) L=341.1m 傾斜堤工 L=318.5m
樋管本体工 N=1基 突堤工

計画平面図

本工事 施工延長 L=659.6.0m

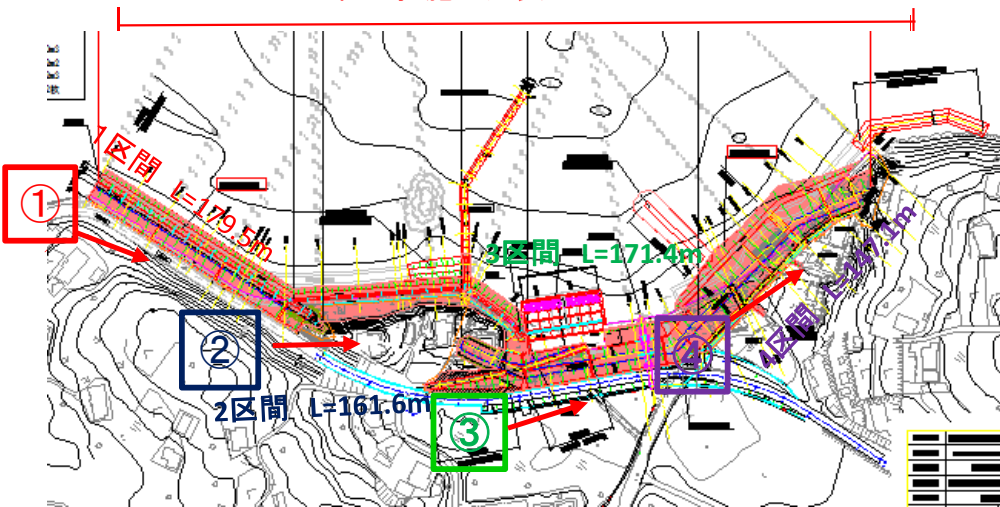

標準横断図

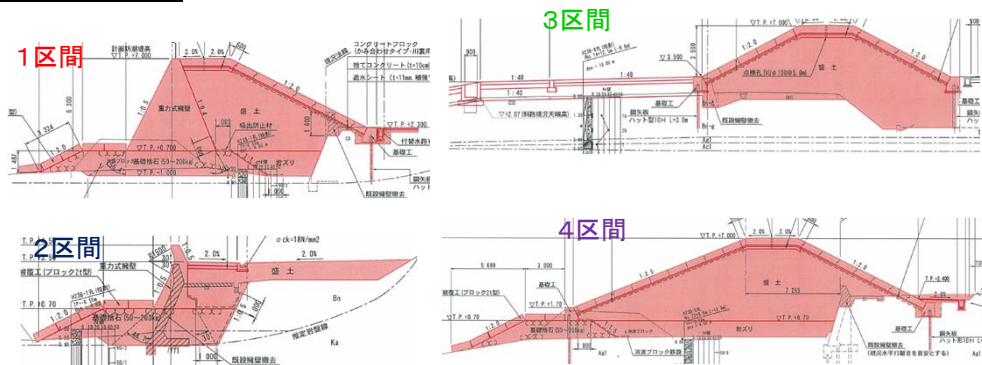

事業位置



一、施工箇所

① 着手前 平成27年2月



② 着手前 平成27年2月



③ 着手前 平成27年2月



④ 着手前 平成27年2月



【高井浜大向地先海岸】 進捗状況

進捗状況

進捗率は11月末で9.6%、完成は平成29年3月末日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



1区間にて消破
ブロックの撤去
作業中

② 平成27年11月末現在の状況



2区間にて既設
擁壁の撤去中

③ 平成27年11月末現在の状況



2区間にて吸出
し防止材、基礎
捨石の作業中
