


【新井田川水系新井田川】進捗状況

事業概要

復旧延長 L=2,248m, 右岸L=1,136.1m, 左岸L=1,111.7m
 築堤盛土工 V=105,070m³
 コンクリートブロック工(2t型) A=16,680m²
 ブロック積工 A=4,564m²
 水門撤去工 N=1門

計画平面図

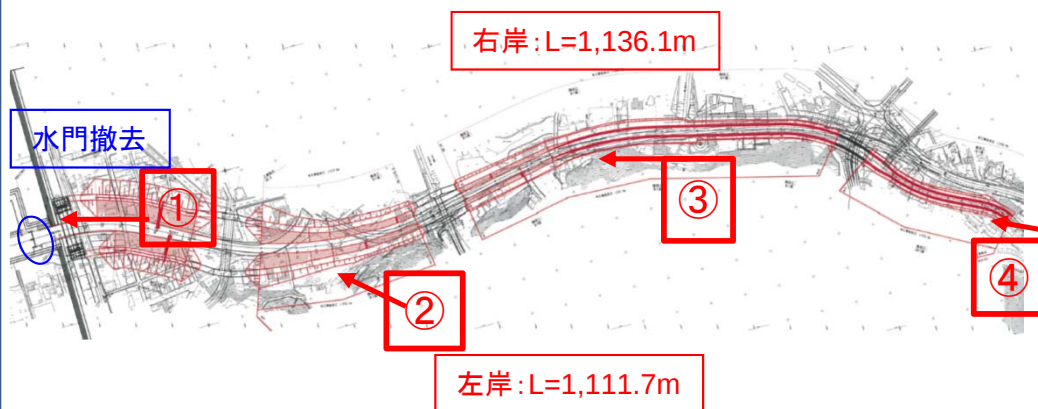

事業位置



新井田川

本吉郡南三陸町志津川字本浜町
地内


① 着手前 平成26年8月



② 着手前 平成26年8月



計画横断面図

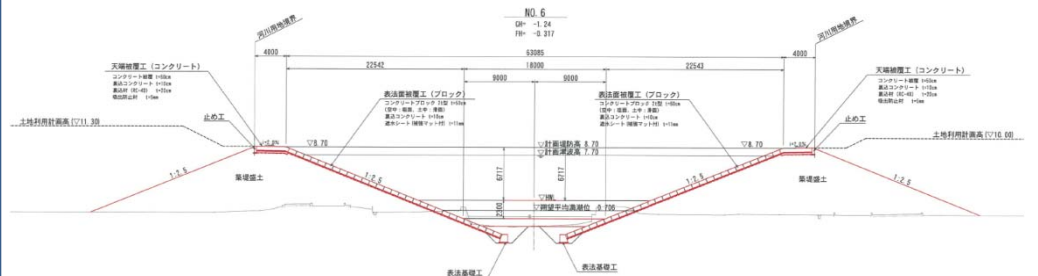

③ 着手前 平成26年8月



④ 着手前 平成26年8月



【新井田川水系新井田川】 進捗状況

進捗状況

現在、築堤盛土および水門撤去を進めております。
完成は平成28年6月30日を予定しています。

A 平成27年 11月末現在の状況



新井田1工区右岸:サーチャージ盛土

B 平成27年 11月末現在の状況



新井田1工区左岸:サーチャージ中

C 平成27年 11月末現在の状況



新井田水門:水門解体完了

D 平成27年 11月末現在の状況



新井田3工区:護岸基礎工
