


【日向貝地先海岸災害復旧工事】進捗状況


事業概要

復旧延長 L=285m
護岸工 直立堤(H=3.6m ~ H=2.5m) L=164m
荷捌棧橋 N=1箇所 斜路工(胸壁工) L=25.9m
樋管工 L=52m 階段工 N=1箇所 消波工 N=271個


計画平面図

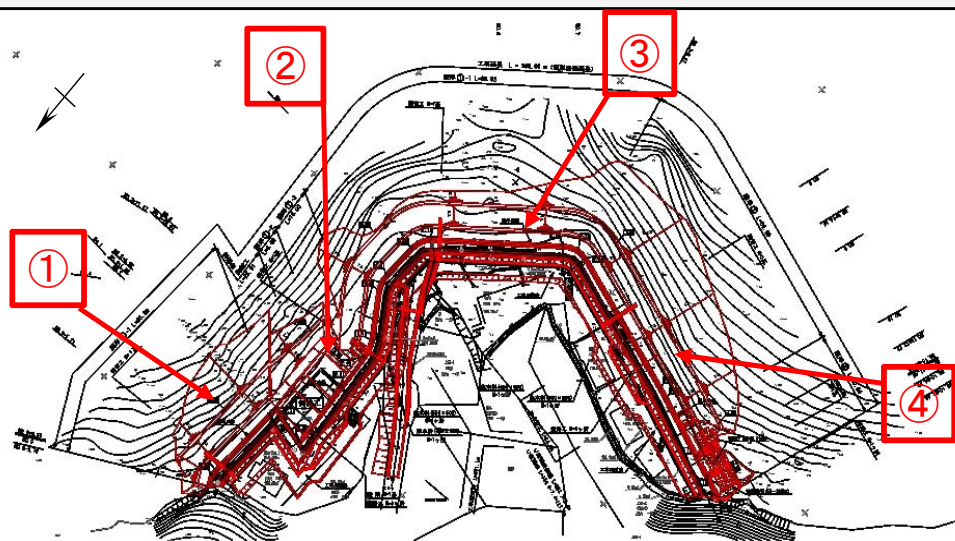

計画横断面図

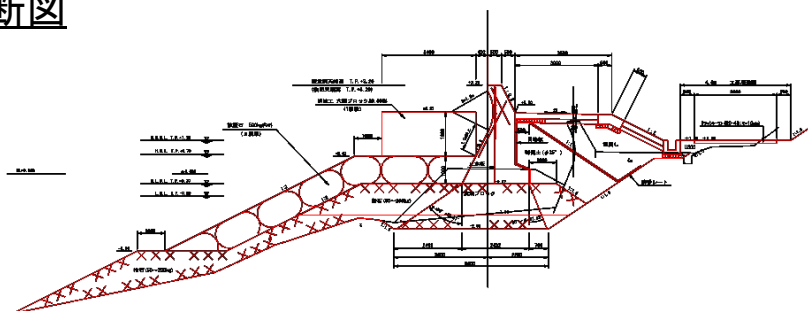

事業位置

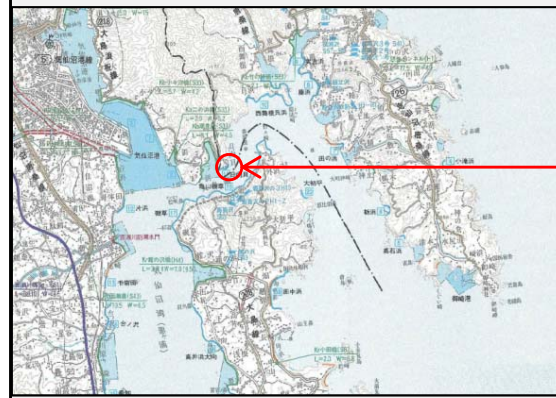

日向貝地先海岸

気仙沼市 唐桑町西舞根地先

① 着手前 平成26年8月



② 着手前 平成26年8月



③ 着手前 平成26年8月



④ 着手前 平成26年8月



【日向貝地先海岸災害復旧工事】進捗状況

進捗状況

先月末の進捗状況は **51.0%** です
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末状況



護岸工状況
(北側)

② 平成27年11月末状況



斜路工状況
(北側)

③ 平成27年11月末状況



裏埋工状況
(中央部)

④ 平成27年11月末状況



裏埋工状況
(中央部)
