

# 【桜川水系桜川(上流工区)】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長		L=359.1m
河川土工	築堤盛土工	V=35,370m <sup>3</sup>
法覆護岸工	コンクリートブロック工(2t型)	A=13,083m <sup>2</sup>
附帯工事	樋門工	N=2基
附帯工事	付替道路工	L=288.2m


## 事業位置



二級河川・桜川水系桜川

南三陸町志津川字松井田地内

## 計画平面図

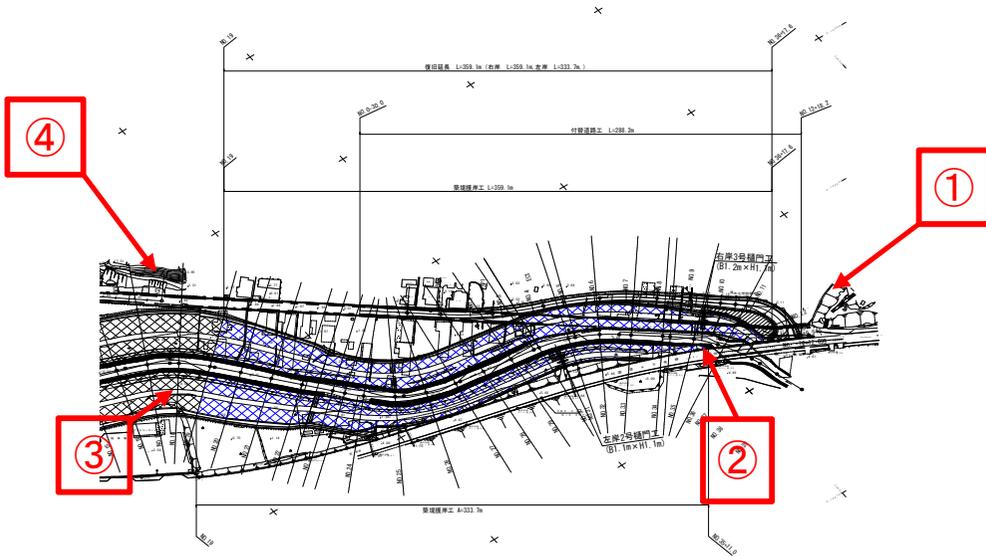

① 着手前 平成26年3月




② 着手前 平成26年3月



## 計画横断面図

本工事計画横断面図



③ 着手前 平成26年3月



④ 着手前 平成26年3月



# 【桜川水系桜川(上流工区)】 進捗状況

## 進捗状況

完成は平成28年3月25日を予定しています。

### ① 平成27年11月末現在の状況



町道の付替えが完了し、右岸築堤盛土工(プレロード工法)を進めています。

### ② 平成27年11月末現在の状況



左岸側 護岸工を進めています。

### ③ 平成27年11月末現在の状況



左岸側 護岸工の作業を進めています。

### ④ 平成27年11月末現在の状況



右岸築堤盛土(プレロード工法)を進めています。

# 【桜川水系桜川(下流工区)】 進捗状況

## 事業概要


復旧延長		L=576.1m
河川土工	築堤盛土工	V=97,600m <sup>3</sup>
法覆護岸工	コンクリートブロック工(2t型)	A=25,505m <sup>2</sup>
樋門・樋管	樋門工	N=3基
道路改良工	付替道路工	N=1式

## 事業位置



二級河川・桜川水系桜川  
南三陸町志津川字清水浜地内

## 計画平面図

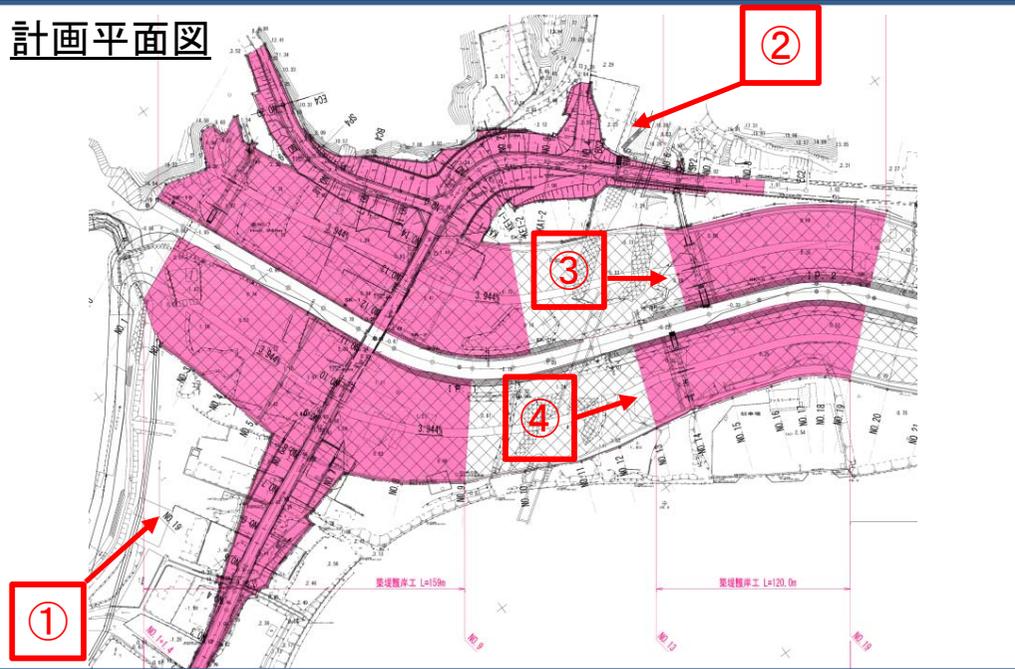

① 着手前 平成26年11月




② 着手前 平成26年11月



## 計画横断面図

桜川復旧標準断面図

S=1:200



③ 着手前 平成26年11月



④ 着手前 平成26年11月



# 【桜川水系桜川(下流工区)】 進捗状況

## 進捗状況

完成は平成29年3月24日を予定しています。

### ① 平成27年11月末現在の状況



### ② 平成27年11月末現在の状況



### ③ 平成27年11月末現在の状況



### ④ 平成27年11月末現在の状況

