

【気仙沼海岸 最知地区海岸】 進捗状況

事業概要

復旧延長 L=731.6m

重力式護岸工(H=7.2m)

コンクリート工


突堤工

L=731.6m


V=23,403m³

N= 1箇所

計画平面図

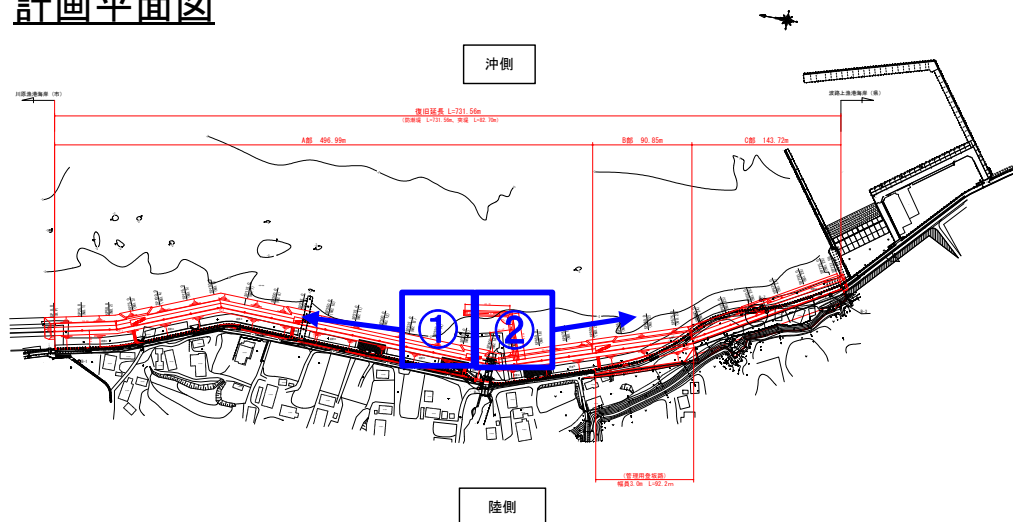

計画横断図

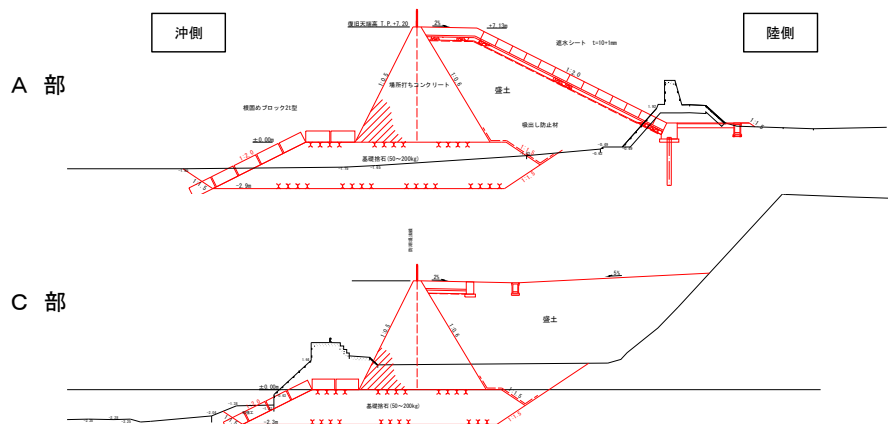

事業位置



気仙沼海岸最知地区海岸
気仙沼市最知森合地先

① 着手前 平成26年7月

起点側(北側)



② 着手前 平成26年7月

終点側(南側)



【気仙沼海岸 最知地区海岸】 進捗状況

進捗状況

先月末の進捗状況は **21.0%** です。
完成は平成29年3月24日を予定しています。

① 平成27年11月末 現在の状況



現在、コンクリート打設の作業を進めています。(北側)

② 平成27年11月末 現在の状況



現在、コンクリート打設の作業を進めています。(南側)
