

【気仙沼海岸片浜地区海岸】 進捗状況

事業概要

復旧延長 L=753.9m
護岸工 L=753.9m
階段工 N=6箇所
樋管工 N=6箇所

事業位置



片浜地区海岸
気仙沼市松崎前浜地先

計画平面図




① 着手前 平成26年4月



② 着手前 平成26年4月



計画横断図

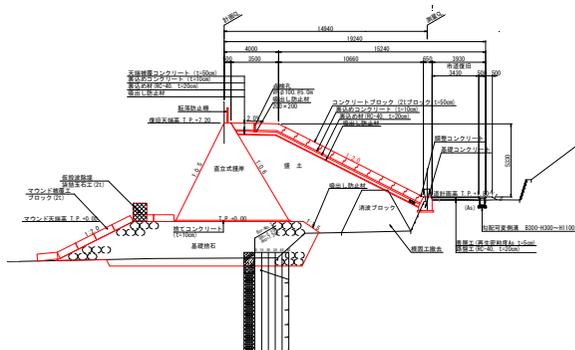

③ 着手前 平成26年4月



【気仙沼海岸片浜地区海岸】 進捗状況

進捗状況

先月末の進捗状況は **45.0%** です。
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末 現在の状況



現在、護岸工のコンクリート打設を進めています。(北側)

② 平成27年11月末 現在の状況



現在、仮締切りの盛土工を進めています。(南側)
