


【大島地区海岸 田中浜地先海岸】 進捗状況

事業概要


復旧延長 L=337.0m

離岸堤	L=113.4m	消波ブロック(8t型、12.5t型)	N= 373個
		被覆方塊ブロック(13.8t型)	N= 719個
潜堤(1)	L=111.8m	消波ブロック(8t型)	N= 776個
潜堤(2)	L=111.8m	被覆ブロック(6t型、9t型)	N=1355個

計画平面図

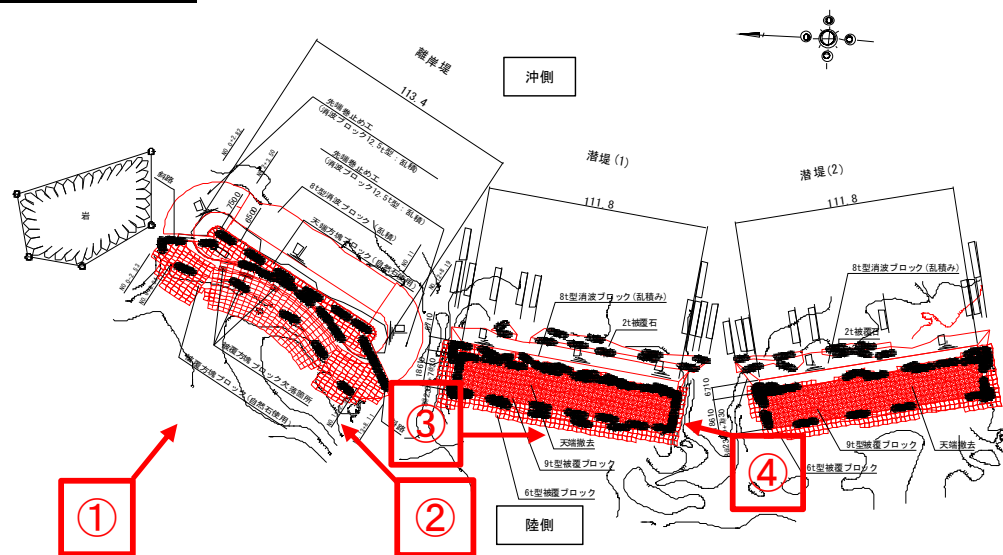

計画横断図

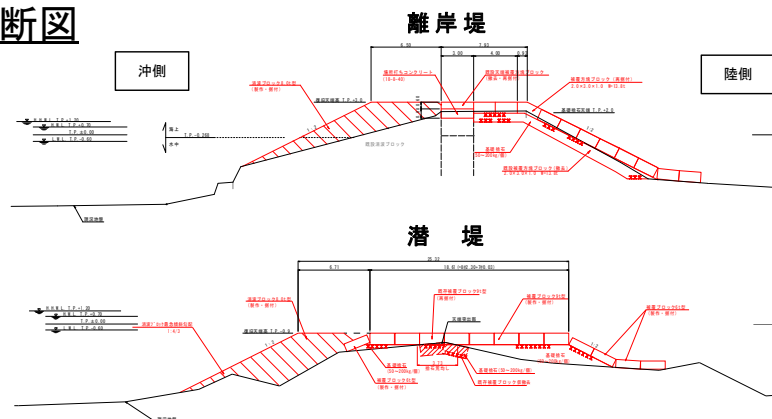

事業位置



大島地区海岸 田中浜地先海岸
気仙沼市外畑地先

① 着手前 平成25年7月

離岸堤



② 着手前 平成25年7月

離岸堤



③ 着手前 平成25年7月

潜堤



④ 着手前 平成25年7月

潜堤



【大島地区海岸 田中浜地先海岸】 進捗状況

進捗状況

先月末の進捗状況は **95.0%** です。
完成は平成28年2月26日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



現在、離岸堤の消波ブロックの据付を進めています。

② 平成27年11月末現在の状況



現在、離岸堤の方塊ブロックの据付を進めています。

③ 平成27年11月末現在の状況



現在、潜堤(2)の消波ブロックの据付を進めています。

④ 平成27年11月末現在の状況



現在、潜堤(2)の消波ブロックの据付を進めています。
