


【長清水川】進捗状況

事業概要


復旧延長 L=505.9m

築堤工 盛土 V=20,358 m³ , 法覆護岸工 A=15,564m²
橋梁工 N=1基 , 樋門工 N=3基


計画平面図

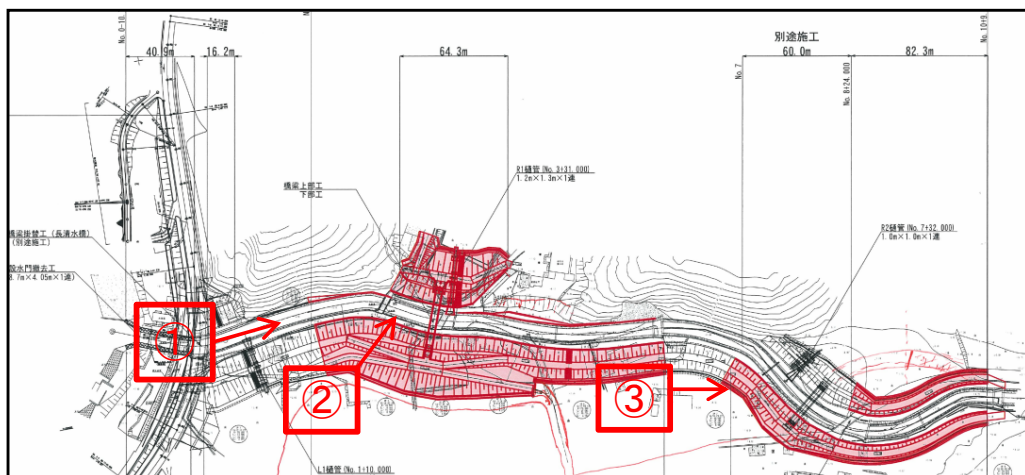

計画横断面図

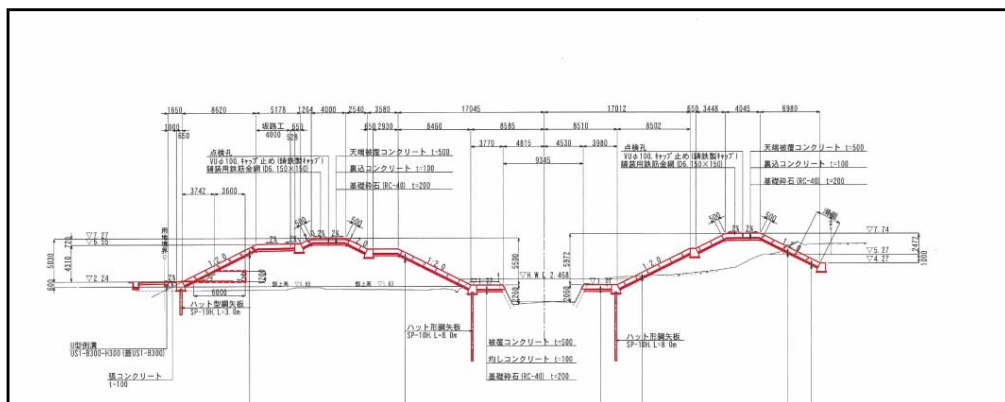

事業位置

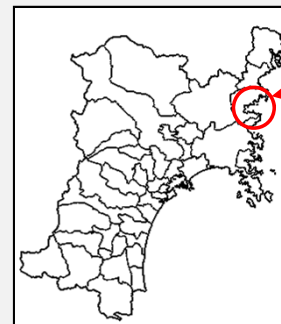

長清水川

本吉郡南三陸町戸倉字長清水川地先

① 着手前 平成24年5月



② 着手前 平成24年5月



③ 着手前 平成27年4月



【長清水川】 進捗状況

進捗状況

現在の進捗状況は**18.7%**です。（先月は18.2%）
完成は平成29年3月24日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



築堤を施工しています。

③ 平成27年11月末現在の状況



護岸基礎工を施工しています。
