


【気仙沼海岸 台ノ沢地区海岸】 進捗状況


事業概要

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 復旧延長 | L=283.4m |
| 重力式護岸工 (H=7.2m) | L=283.4m |
| コンクリート工 | V=9,093m ³ |
| 階段工 | N= 2箇所 |
| 樋管工 | N= 2箇所 |

計画平面図

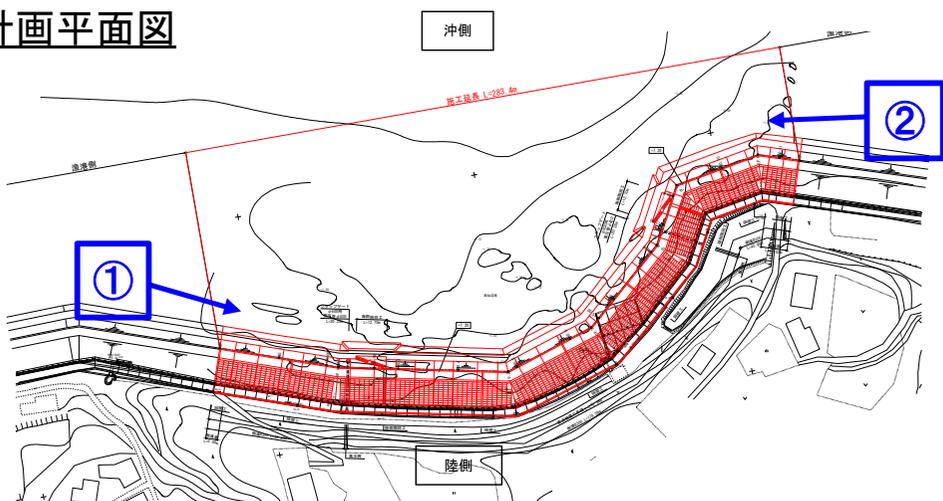

計画横断図

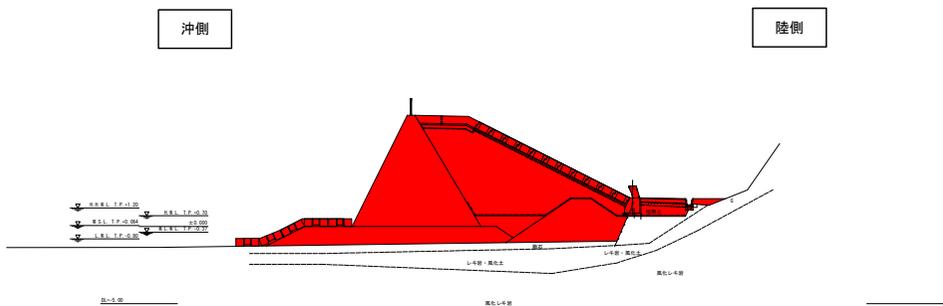

事業位置



気仙沼海岸台ノ沢地区海岸
気仙沼市岩月台ノ沢地先

① 着手前 平成26年7月

起点側(北側)より



② 着手前 平成26年7月

終点側(南側)より




【気仙沼海岸 台ノ沢地区海岸】 進捗状況

進捗状況

先月末の進捗状況は **21.0%** です。
完成は平成29年3月24日を予定しています。

① 平成27年11月末 現在の状況

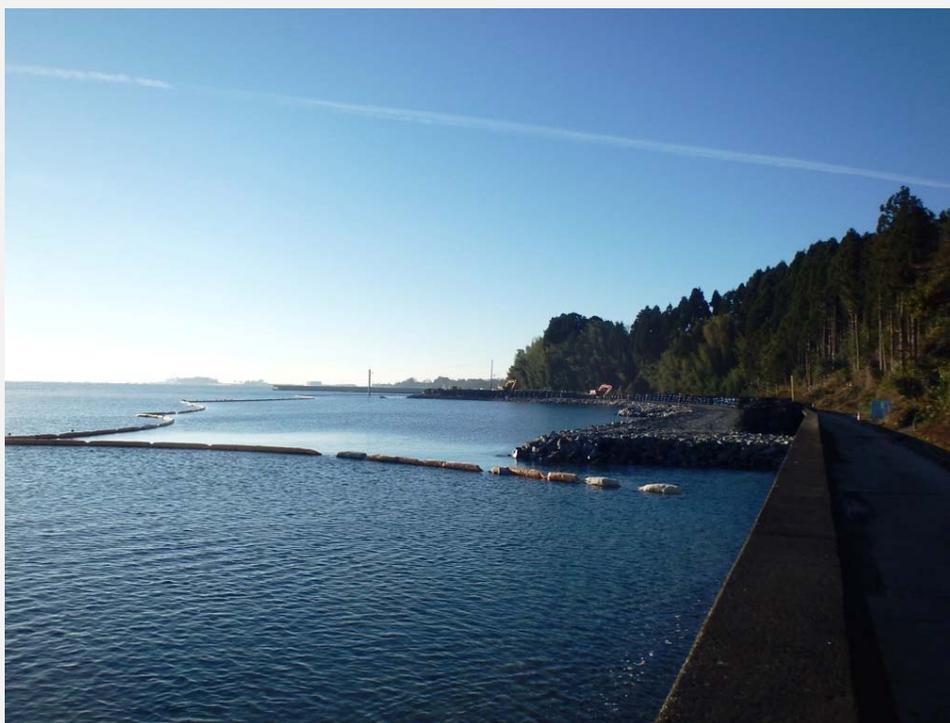

現在、基礎捨石の作業を進めております。(北側)

② 平成27年11月末 現在の状況



現在、基礎捨石の作業を進めております。(南側)
