

防潮堤の整備計画について

１ 市管理漁港における防潮堤整備計画の進捗状況について（H26.10.31現在）

管 理 者	海岸箇所数	防潮堤の高さ		復 旧 位 置				高さ・復旧位置概ね合意した海岸	進捗状況 (H26.10.31現在)
		L1復旧	原形復旧	前出し	現状	引き堤	調整中		
気仙沼市	C漁港海岸 25	33	6	4	7	28	0	23	工事着手：3箇所
計		(重複有り)		(重複有り)				92%	

(1) 事業進捗状況(25漁港39箇所)

	L1 防潮堤		原形復旧		備考
	漁港数	箇所数	漁港数	箇所数	
①業務(工事)未発注	6	6	2	2	原形復旧：工事対象とする
②業務(工事)発注準備	4	4	1	1	原形復旧：工事対象とする
③測量調査	2	2	0	0	
④概略設計	10	11	0	0	
⑤詳細設計	8	10	0	0	
⑥工事施工	0	0	3	3	
計	24	33	6	6	
	(重複有り)		(重複有り)		

２ 国・宮城県管理の海岸防潮堤整備計画について（H26.10.31現在）

管 理 者	海岸箇所数	防潮堤の高さ		復 旧 位 置				高さ・復旧位置概ね合意した海岸	進捗状況 (H26.10.31現在)
		L1復旧	原形復旧	前出し	現状	引き堤	調整中		
宮城県気仙沼振興事務所南三陸支所	A農地海岸 8	0	8	0	8	0	0	8	工事着手：8箇所 (内完了：3箇所)
宮城県気仙沼振興事務所水産漁港部	B漁港海岸 13	12	1	1	4	8	0	8	
宮城県気仙沼土木事務所	D建設海岸 24	17	10	10	13	6	0	19	工事着手：13箇所
	E港湾海岸 4	4	1	1	2	1	0	4	工事着手：2箇所
宮城県気仙沼振興事務所農林振興部	F治山施設 6	1	5	0	6	0	0	5	工事着手：1箇所
宮城北部森林管理署一林野庁	G治山施設 7	7	0	4	0	4	0	7	工事着手：1箇所 (内完了：1箇所)
計	(1) 62	41	25	16	33	19	0	(2) 51	
		(重複有り)		(重複有り)				68	(2)/(1) 82%

※防潮堤の高さ及び復旧位置案は1つの海岸で複数の形態があるため合計値が異なります。

※高さ・復旧位置について概ね合意した海岸は、各管理者が設置方針案を地元に説明し、測量設計及び工事着手している海岸です。

※気仙沼漁港を7海岸((1)梶ヶ浦、(2)小々汐、(3)大浦、(4)浜町、(5)内湾、(6)港町・魚市場、(7)前浜)に分割し計上した。

※亀山磯草地先海岸を4海岸((1)外浜1、(2)外浜2、(3)葡萄沢、(4)磯草)に分割し計上した。

※治山施設三島海岸(林野庁管理)は、事業実施において建設海岸(県気仙沼土木事務所管理)に変更予定です。

市管理漁港 防潮堤整備計画 進捗状況

H26.10.31現在

管理者	No	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	施設の高さ(T. P)			位置 現状 前出し 引き堤	合意状況	現在の進捗状況		備考
				被災前 現況高 (m)	被災後 計画高 (m)	L1 原形 その他					
気仙沼市	1	大沢(唐桑)漁港	291.4	4.62	8.00	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	災害
	2	館漁港	100.0	—	11.30	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	3	岩井沢漁港	120.0	—	11.30	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	4	載鉤漁港	100.0	—	11.30	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	5	小田浜漁港	—	—	—	—	—	—		—	整備計画なし
	6	只越漁港	151.1	6.12	11.30	L1	引き堤	○	詳細設計	用地境界立合い済み	災害
			80.0	—	11.30	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.12発注予定	新規
	7	金取漁港	—	—	—	—	—	—		—	整備計画なし
	8	石浜(唐桑)漁港	438.0	—	11.30	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	後浜・砂子浜・高石浜 新規
	9	馬場(唐桑)漁港	—	—	—	—	—	—		—	整備計画なし
	10	笹浜漁港	—	—	—	—	—	—		—	整備計画なし
	11	滝浜(唐桑)漁港	60.0	—	11.30	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.11発注予定	新規
	12	長浜漁港	—	—	—	—	—	—		—	整備計画なし
	13	津本漁港	80.0	—	11.20	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	14	神止浜漁港	85.0	4.40	4.40	原形	現状	○	工事施工	H26.11完成	災害
			80.0	—	11.20	L1	引き堤	○	業務未発注	高さについて検討中	新規
	15	宿舞根漁港	440.6	3.50	9.90	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	浦災害
			503.8	3.20	9.90	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	藤浜北災害
			798.6	3.20	9.90	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	藤浜南災害
			257.7	2.6～3.2	2.6～3.2	原形	現状	○	工事施工	H26.12完成	実吉・西舞根貝浜災害
			165.0	—	9.90	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	宿浦 新規
			100.0	—	9.90	L1	引き堤	○	業務未発注	隣接事業と調整中	舞根 新規
	16	鶴ヶ浦漁港	774.7	2.46	9.90	L1	現状	○	概略設計	高さについて検討中	災害
			238.2		2.50	原形	現状	○	工事発注準備	H26.12発注予定	災害
			250.0	—	9.90	L1	引き堤	○調整中	業務未発注	高さについて検討中	新規
	17	川原漁港	201.9	4.50	7.20	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	千岩田災害
			918.00	4.50	7.20	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	川原災害
	18	杉ノ下漁港	160.0	—	9.80	L1	引き堤	○	測量調査	計画案 作業中	新規
	19	磯草漁港	250.0	—	7.00	L1	引き堤	未	業務未発注	隣接事業と調整中	新規
	20	長崎漁港	80.0	—	11.80	L1	引き堤	未	業務未発注	隣接事業と調整中	新規
	21	横沼漁港	324.2	5.10	5.10	原形	現状	○	工事施工	H27.3完成	災害
			120.0	—	7.00	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	新規
	22	駒形漁港	291.2	4.50	7.00	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	災害
	23	要害漁港	293.5	4.10	7.00	L1	前出し	○	詳細設計	用地境界立合い済み	浅根 災害
			273.1		4.10	原形	現状	○	工事未発注	浅根防潮堤と一括発注予定	要害 災害
			200.0	—	7.00	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	要害 新規
	24	大谷漁港	260.0	4.20	9.80	L1	引き堤	○調整中	概略設計	シミュレーション検討中	新規
	25	前浜漁港	120.0	—	9.80	L1	引き堤	○調整中	業務未発注	地元案 検討中	新規
	26	赤牛漁港	150.0	—	9.80	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.11発注予定	新規
	27	大沢(津谷)漁港	200.0	—	9.80	L1	引き堤	○	業務発注準備	H26.11発注予定	新規
	28	土台磯漁港	80.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事未発注	隣接工事と調整中	災害
	29	二十一浜漁港	200.0	—	14.70	L1	引き堤	○	測量調査	計画案作成中	新規
	30	今朝磯漁港	—	—	—	—	—	—		—	整備計画なし
	31	蔵内漁港	350.0	—	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	詳細設計 作業中	蔵内 新規
			150.0	—	9.80	L1	引き堤	○	概略設計	概略設計 作業中	草木沢 新規

○地区海岸数 3 1

○整備地区海岸数 2 5

○合意地区海岸数 2 3

○未合意地区海岸数 2

国・県の防潮堤整備計画の復旧状況


2014.10.31現在

管 理 者	No	地 区 海 岸 名	堤防護岸 概算延長 (m)	施設の高さ(T、P)			位置 現状 前出し 引き堤	合意 状況	進 捗 状 況	備 考
				被災前 現況高 (m)	被災後 計画高 (m)	L1 原形 その他				
(農地海岸) 宮城県 気仙沼振興事務所 南三陸支所	A1	中井地(神止)	734.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手	
	A2	中の浜	162.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手	
	A3	社松	159.0	4.20	4.20	原形	現状	○	工事着手	
	A4	船尻	128.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手	
	A5	鶴ヶ浦(三の浜)	489.0	3.00	3.00	原形	現状	○	完了	
	A6	田の尻	281.0	4.00	4.00	原形	現状	○	完了	
	A7	横沼	122.0	4.50	4.50	原形	現状	○	完了	
	A8	登米沢	813.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手	
(漁港海岸) 宮城県 気仙沼振興事務所 水産漁港部	B1	鮎立漁港	634.0	2.42	8.10	L1	引き堤	○	詳細設計	
	B2	小鯖漁港	700.0	2.37	9.90	L1	引き堤	未	調査測量	新規
	B3	気仙沼漁港 (1)梶ヶ浦	195.0	2.80～3.70	7.20	L1	引き堤	○	測量設計	
		気仙沼漁港 (2)小々汐	633.0		2.80	原形	現状	○	測量設計	
		気仙沼漁港 (3)大浦・浪板	3,342.0		7.2～5.0	L1	現状	未	調査測量	新規(一部) 浪板地区は合意
		気仙沼漁港 (4)浜町	708.0		5.00	L1	現状	○	測量設計	
		気仙沼漁港 (5)内湾	515.0		5.10	L1	引き堤	○	測量設計	新規
		気仙沼漁港 (6)港町・魚市場前	1,985.0		5.00	L1	現状	未	調査測量	新規
		気仙沼漁港 (7)前浜	590.0		7.20	L1	引き堤	○	測量設計	
	B4	浦の浜漁港	1,706.0	3.11	7.80	L1	引き堤	未	調査測量	新規
	B5	松岩漁港	671.0	3.12	7.20	L1	引き堤	○	測量設計	
	B6	波路上漁港	2,500.0	4.52	7.20	L1	前出し	○	測量設計 測量設計	新規(一部)
	B7	日門漁港	83.0 485.0	—	9.80	L1	引き堤	未	調査測量	新規
(建設海岸) 宮城県 気仙沼土木事務所	D1	荒谷前	217.0	5.50	11.30	L1	前出し	○	工事着手	
	D2	稲村浜	238.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手	
	D3	後馬場	230.0	6.10	11.30	L1	引き堤	○	工事着手	
	D4	高石浜	116.0	4.50	4.50	原形	現状	○	工事着手	
	D6	西舞根貝浜	250.0	3.20	3.20	原形	現状	○	工事着手	
	D8	田の浜	78.0	2.50	9.90	L1	現状	○	発注準備	
	D9	日向貝	285.0	3.20	3.20	原形	現状	○	工事着手	
	D10	片浜	754.0	3.10	7.20	L1	前出し	○	工事着手	
	D11	千岩田	357.0	3.10	7.20	L1	前出し	○	工事着手	
	D12	台の沢	283.0	3.10	7.20	L1	前出し	○	工事着手	
	D13	最知	732.0	4.00	7.20	L1	前出し	○	工事着手	
	D14	岩井崎	109.0	5.00	9.80	L1	現状	未	調整中	
	D15	杉の下	15.0	3.90	9.80	L1	現状	○	発注準備	
	D16	亀山磯草(1)	164.0 171.0	3.00 3.00	7.00 3.20	L1 原形	前出し 現状	○	発注準備	
		亀山磯草(2)	112.0	3.20	3.20	原形	現状	○	発注準備	
		亀山磯草(3)	334.0	3.20	3.20	原形	現状	○	発注準備	
		亀山磯草(4)	258.0	3.20	3.20	原形	現状	未	調整中	
	D17	磯草	263.0	4.50	7.00	L1	前出し	未	調整中	
	D18	高井浜大向	724.0 381.0	4.50	7.00 4.50	L1 原形	前出し 引き堤 現状	○	工事着手	
	D19	中沢	490.0 226.0	4.50	7.00 4.50	L1 原形	前出し 現状	○	工事着手	
	D21	沖の田	188.0	3.90	9.80	L1	前出し 引き堤	○	工事着手	
	D22	(1)大谷	180.0	4.20	9.80	L1	引き堤	未	調整中	工事着手(人エリーフ)
		(2)三島	600.0	4.25	9.80	L1	引き堤	未		林野庁から県事業へ移管
	D23	中島	200.0 800.0	5.50	14.70	L1	引き堤	○	発注準備 調整中	登米沢新規 工事着手(人エリーフ)
(港湾海岸) 宮城県 気仙沼土木事務所	E1	御崎港	143.6 171.0	4.49	11.20 11.20	L1 L1	引き堤	○	発注準備	下の浜 御崎・新規
	E2	気仙沼港 梶ヶ浦	456.6	2.82	7.20	L1	前出し	○	工事着手	
	E3	気仙沼港 小々汐	501.8	2.64	3.70	原形	現状	○	発注準備	
	E4	気仙沼港 朝日	1,513.1	3.19	7.20	L1	現状	○	工事着手	
(治山施設) 宮城県 気仙沼振興事務所 農林振興部	F1	高石浜	40.0	6.20	6.20	原形	現状	○	完了	
	F2	田中浜	846.0	3.90	3.90	原形	現状	○	発注準備	気仙沼土木事務所 工事着手(人エリーフ)
	F3	小田ノ浜	474.0	3.50	3.50	原形	現状	○	発注準備	
	F4	へノ浜	219.0	4.00	4.00	原形	現状	○	発注準備	
	F5	温浜	236.0	4.50	4.50	原形	現状	○	発注準備	
	F6	崎野	307.0	2.6～3.0	7.20	L1	現状	未	詳細設計	
(治山施設) 林野庁 東北森林理局 宮城北部 森林管理署	G1	尾崎・千岩田	514.0	4.50	7.20	L1	前出し	○	詳細設計	民有林
	G2	岩井崎	1,164.0	3.50	9.80	L1	前出し 引き堤	○	詳細設計	民有林
	G3	御伊勢浜	475.0	3.90	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	民有林
	G4	沖ノ田	390.0	3.90	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	民有林
	G5	野々下・沖ノ田	400.0	5.00	9.80	L1	引き堤	○	詳細設計	国有林
	G6	野々下	131.8	3.80	9.80	L1	前出し	○	完了	国有林
	G7	大谷(沼尻)	380.0	3.00	9.80	L1	前出し	○	詳細設計	国有林
合計	53	62	34,752.9							

○地区海岸数 6 2

○合意状況数 5 1

○未合意数 1 1

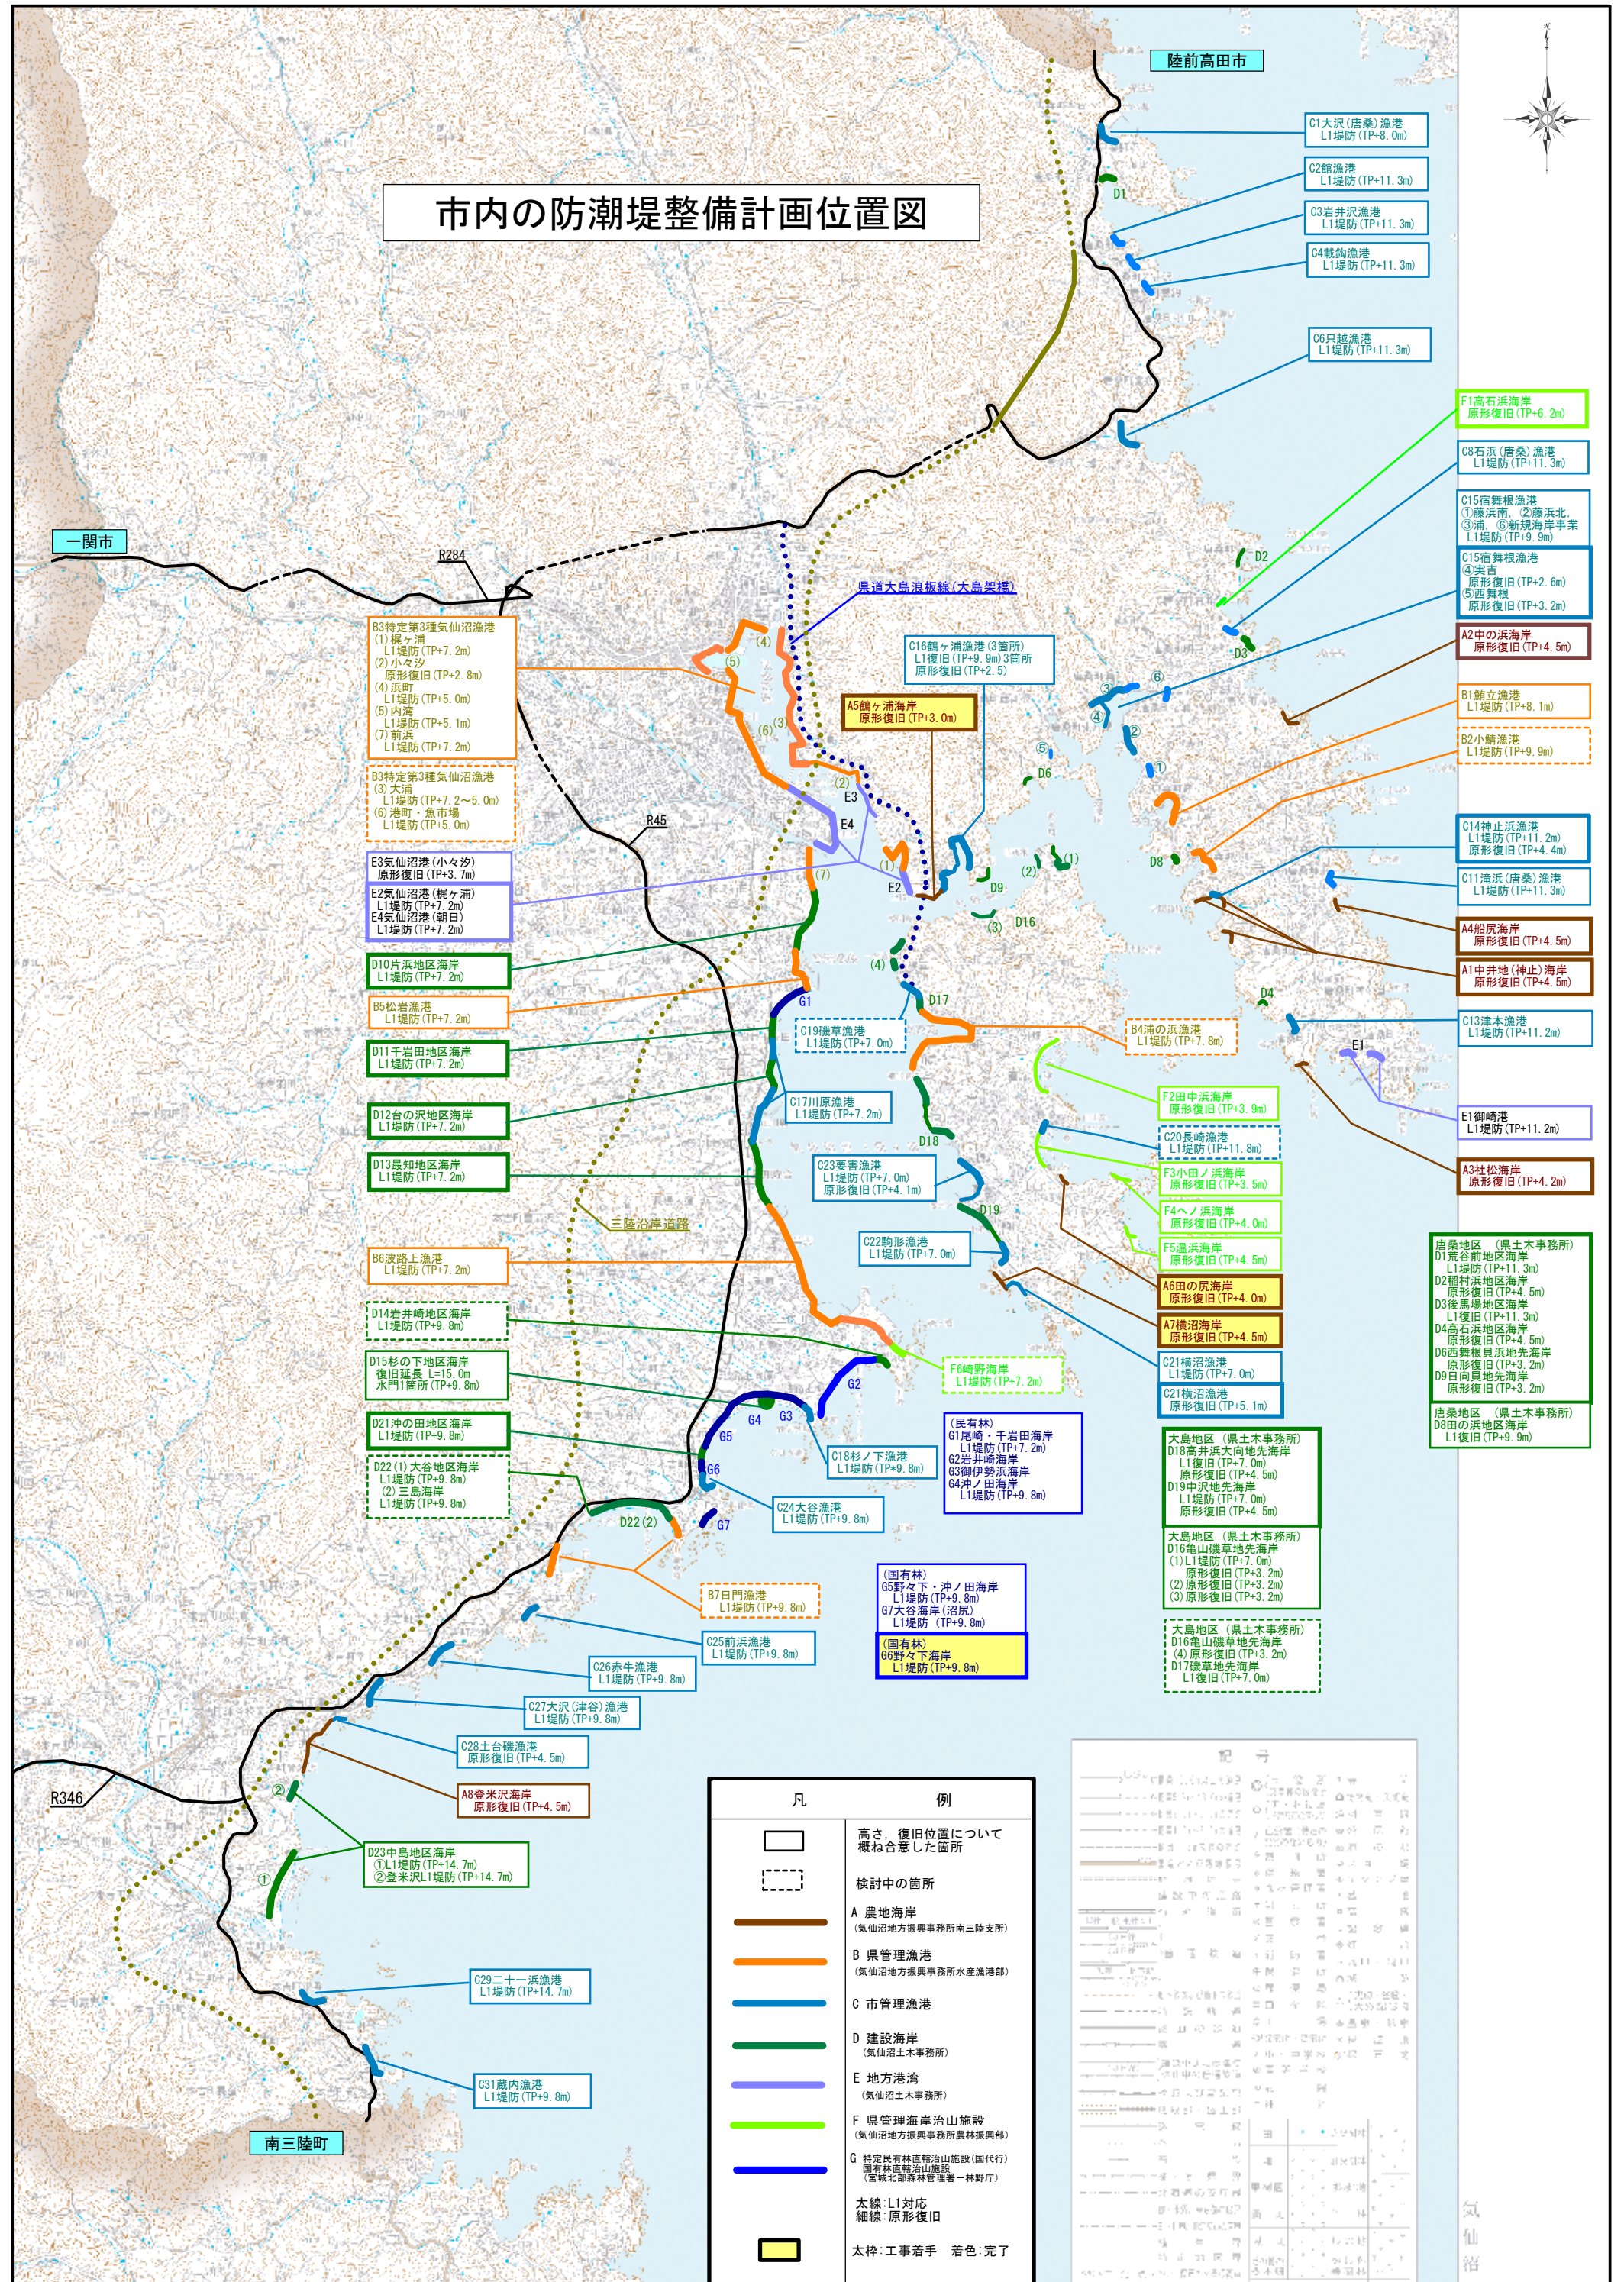

市内の防潮堤整備計画位置図

凡	例
	高さ、復旧位置について概ね合意した箇所
	検討中の箇所
	A 農地海岸 (気仙沼地方振興事務所南三陸支所)
	B 県管理漁港 (気仙沼地方振興事務所水産漁港部)
	C 市管理漁港 (気仙沼土木事務所)
	D 建設海岸 (気仙沼土木事務所)
	E 地方港湾 (気仙沼土木事務所)
	F 県管理海岸治山施設 (気仙沼地方振興事務所農林振興部)
	G 特定民有林直轄治山施設(国代行) 国有林直轄治山施設 (宮城北部森林管理署一林野庁)
	太線:L1対応 細線:原形復旧
	太枠:工事着手 着色:完了

