

# 【折立川】進捗状況

## 事業概要


復旧延長 L=1,062.0m  
 築堤工 盛土 V=163,640 m<sup>3</sup> , 法覆護岸工 A=54,110 m<sup>2</sup>  
 樋門工 N=7基 , 道路工 L= 660m

## 事業位置



折立川  
 本吉郡南三陸町戸倉字折立地先

## 計画平面図

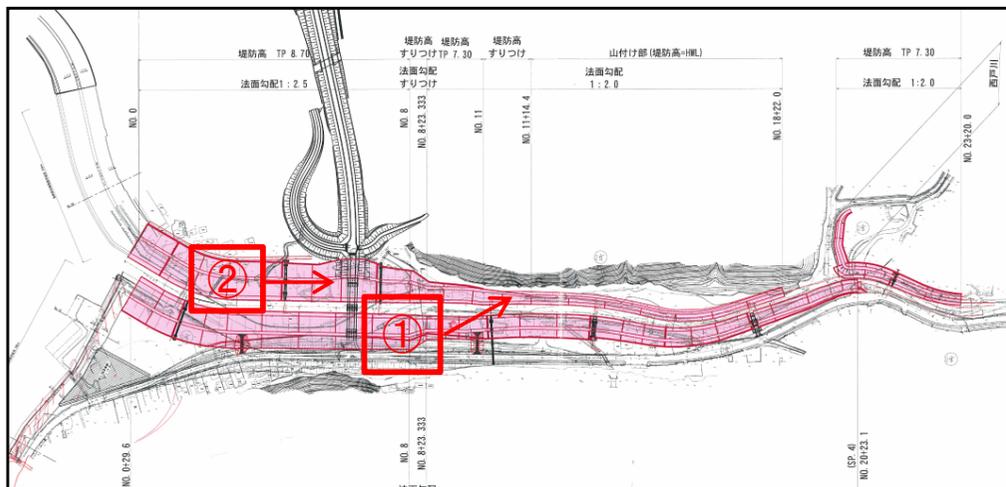


## ① 着手前 平成24年5月



## ② 着手前 平成24年5月



## 計画横断図

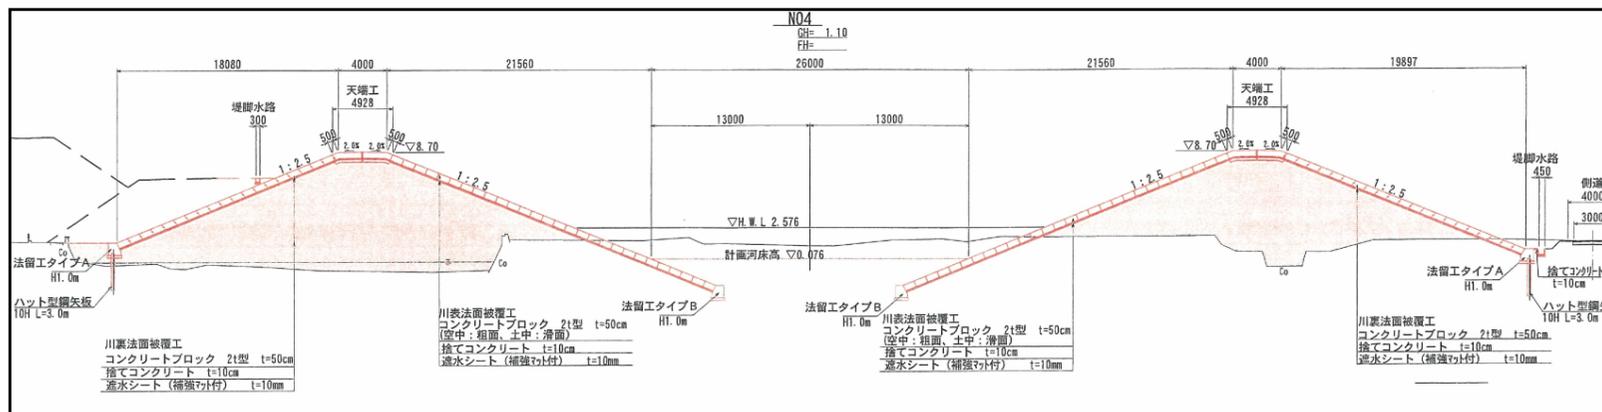

# 【折立川】 進捗状況

## 進捗状況

現在の進捗状況は**15.9%**です。（先月は15.4%）  
完成は平成29年3月24日を予定しています。

### ① 平成27年11月末現在の状況



右岸上流護岸を施工しています。

### ② 平成27年11月末現在の状況



右岸橋台と橋脚を施工しています。
