

【八幡川水系八幡川】 進捗状況

事業概要


復旧延長 L=878m, 左岸L=878m

築堤盛土工 V=102,220m³
コンクリート工(2t型) A=17,134m²
水門撤去工 N=1門

計画平面図



事業位置

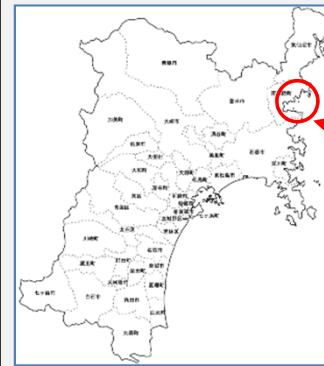

八幡川

本吉郡南三陸町志津川字本浜町
地内

① 着手前 平成26年8月



② 着手前 平成26年8月




③ 着手前 平成26年8月



④ 着手前 平成26年8月



計画横断図



【八幡川水系八幡川】 進捗状況

進捗状況

現在、築堤盛土および水門撤去を進めております。
完成は平成28年6月30日を予定しています。

A 平成27年 11月末現在の状況



八幡2工区：1次盛土完了、プレロード中

B 平成27年 11月末現在の状況



八幡3工区：プレロード盛土掘削

C 平成27年 11月末現在の状況



八幡4工区：一部仮締切、床掘り

D 平成27年 11月末現在の状況



八幡水門：底版解体完了
