

見える復興
見せる復興
宮城県土木部

樋管工 N=2基 側道工 L=1,147m(河川部含む)

【中島地区海岸堤防】 進捗状況

進捗状況

現在の進捗状況は **12.0%**です。（先月は9.3%）
完成は平成30年3月23日を予定しています。

① 平成27年 11月末現在の状況（導流堤の状況）



海岸部の盛土を開始しました。

② 平成27年 11月末現在の状況（左岸 県道から東）



シーサイドパレス解体(完了)と仮設道路の設置を行っています。

③ 平成27年 11月末現在の状況（中島地区海岸）




【中島地区海岸離岸堤】進捗状況


事業概要

復旧延長 L=500m 離岸堤 5基
 基礎捨石投入 49,685 m³、捨石荒均し 27,503 m²
 被覆ブロック製作・据付け(2~4t) N=5,873個
 消波ブロック製作・据付(12.5t) N=3,635個
 消波ブロック撤去・再設置(12.5t) N=2,385個

計画平面図

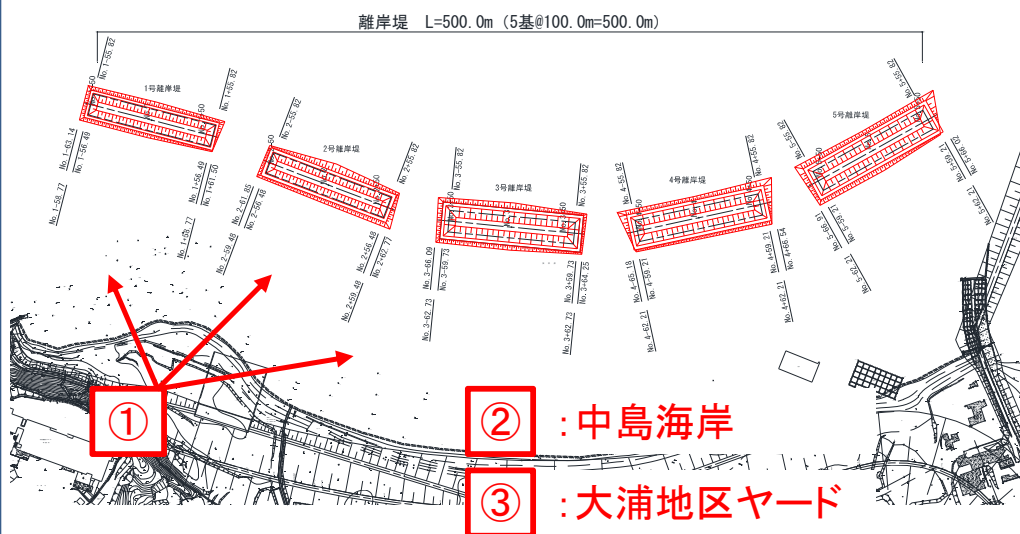

計画横断図

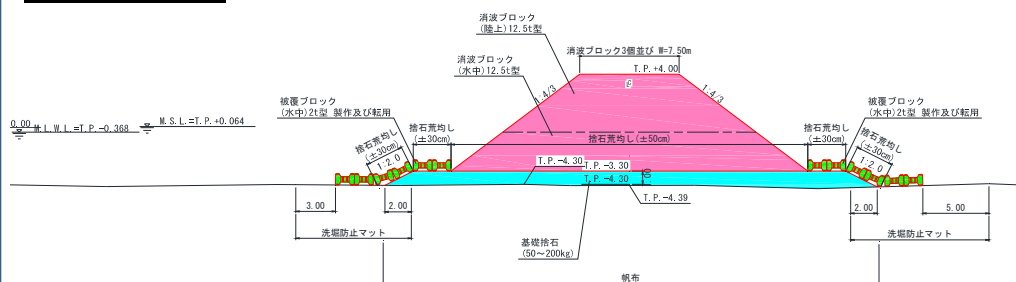

事業位置



中島地区海岸
 気仙沼市本吉町中島地先

① 着手前 平成26年12月



② 着手前 平成26年11月



③ 着手前 平成26年12月



【中島地区海岸離岸堤】進捗状況

進捗状況

現在の進捗状況は **60.1%**です。（先月は55.4%）
完成は平成29年3月24日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況（施工区域全体）



現在、構造物陸上撤去作業を完了し、作業船（起重機船、ガット船等）による海上作業を行っています。

② 平成27年11月末現在の状況（作業船による海上作業）



ガット船による捨石投入、起重機船によるブロック据付作業を行っています。

③ 平成27年11月末現在の状況（消波ブロック製作作業）



石巻のブロックヤードでは消波ブロックの製作を開始しました。
