

# 【港川水系港川(上流工区)】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長

河川土工 築堤盛土工  
法覆護岸工 コンクリートブロック工(2t型)  
天端被覆工


L=308.3m

V=5,300m<sup>3</sup>


A=3,748m<sup>2</sup>

L=308m

## 計画平面図

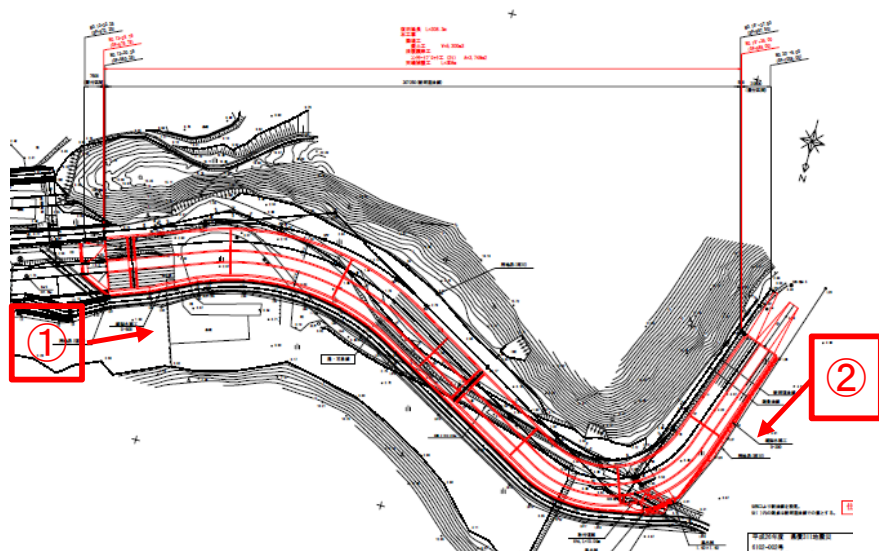

## 計画横断面図

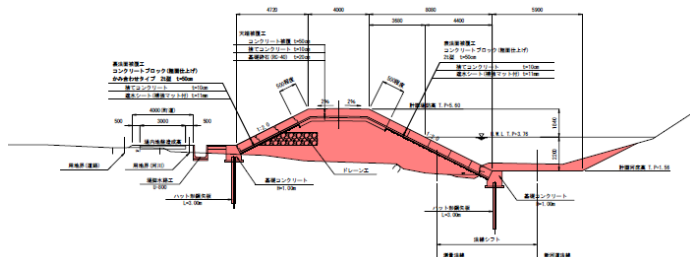

## 事業位置



二級河川・港川水系港川

南三陸町歌津字港地内

① 着手前 平成26年7月



② 着手前 平成26年7月



# 【港川水系港川(上流工区)】 進捗状況

## 進捗状況

平成27年9月16日 竣工しました。

### ① 平成27年9月完成



上流を望む。

### ② 平成27年9月竣工完成



下流を望む。


# 【港川水系港川(下流工区)】 進捗状況

## 事業概要


復旧延長  
河川土工 築堤盛土工  
法覆護岸工 コンクリートブロック工 (2t型)  
地盤改良工 一式  
樋門工 N= 2基

$L = 507.0\text{m}$   
 $V = 107,500\text{m}^3$   
 $A = 18,126\text{m}^2$   
一式  
 $N = 2\text{基}$

## 計画平面図

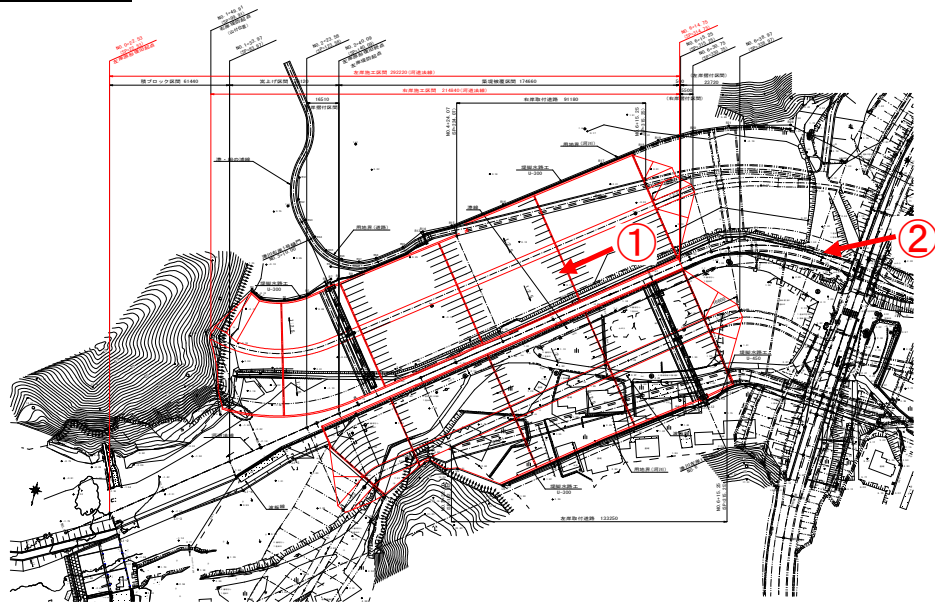

## 計画横断面図



## 事業位置



二級河川・港川水系港川  
南三陸町歌津字港地内

## ① 着手前 平成26年10月



## ② 着手前 平成26年10月



# 【港川水系港川(下流工区)】 進捗状況

## 進捗状況

完成は平成29年3月24日を予定しています。

### ① 平成27年11月末現在の状況



右岸の地盤改良を終え、護岸工の仮設工(矢板)を進めております。

### ② 平成27年11月末現在の状況



右岸の地盤改良を終え、仮道路の施工を進めております。
