

【高石浜地先海岸災害復旧工事】進捗状況

事業概要

復旧延長 L=119.7m
護岸工 直立堤(H=3.8m ~ H=4.5m) L=50.5m
被覆ブロック N=187個 斜路工 L=25.3m
カルバート工 L=6.7m 消波工 N=434個


事業位置



高石浜地先海岸
気仙沼市唐桑町松園地先

計画平面図

計画横断図

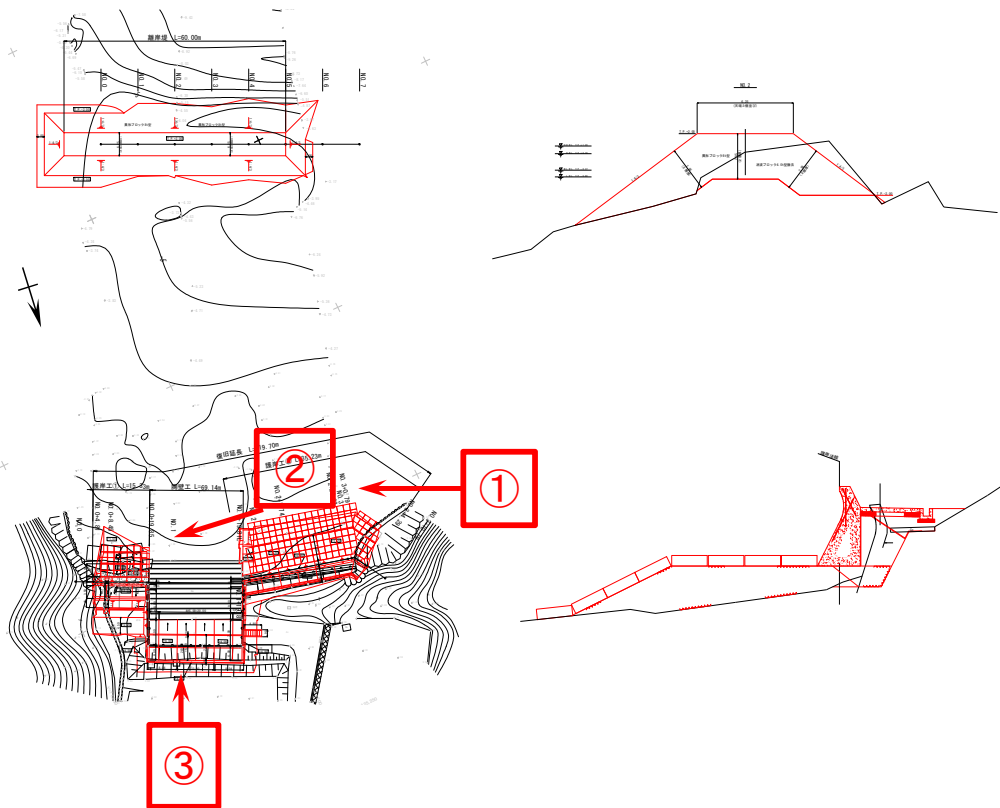

① 着手前 平成26年8月



② 着手前 平成26年8月



③ 着手前 平成26年8月



【高石浜地先海岸災害復旧工事】進捗状況

進捗状況

先月末の進捗状況は **51.0%** です
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末状況



護岸工施工
状況(西側)

② 平成27年11月末状況



護岸工施工
状況(東側)

③ 平成27年11月末状況



離岸堤施工
状況(南側)
