

【気仙沼海岸 千岩田地区海岸】 進捗状況

事業概要

復旧延長 L=357.1m

重力式護岸工(H=7.2m)

L=357.1m


コンクリート工

V=12,294m³


地盤改良工

N= 912本

計画平面図

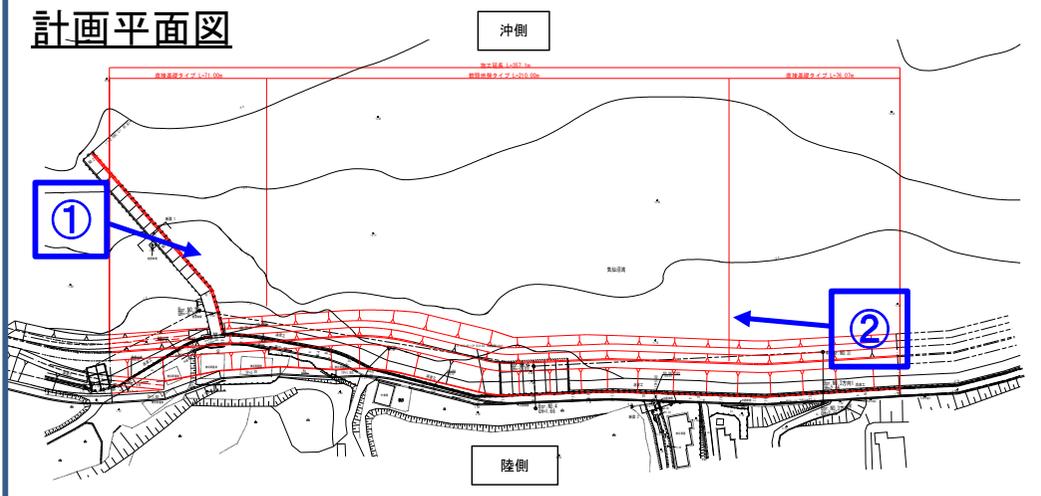

計画横断図

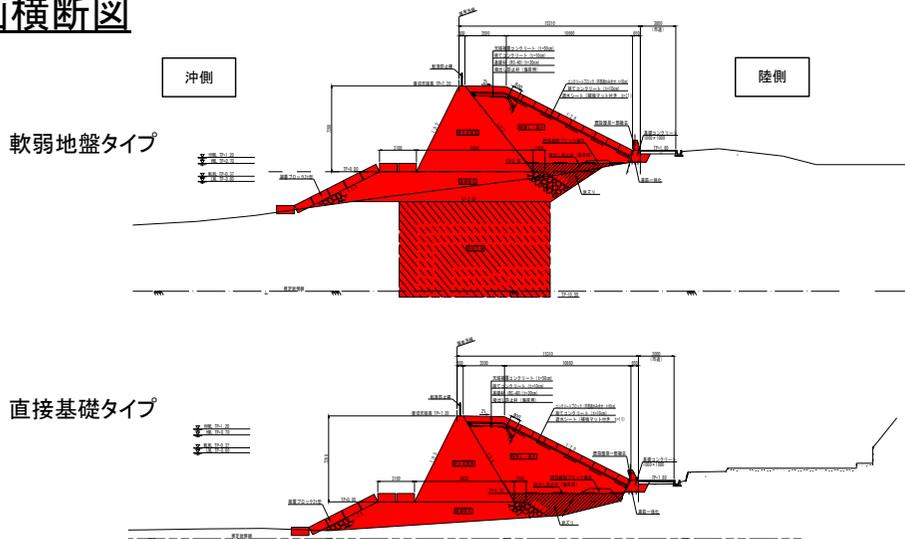

事業位置



気仙沼海岸千岩田地区海岸
気仙沼市岩月千岩田地先

① 着手前 平成26年7月

起点側(北側)



② 着手前 平成26年7月

終点側(南側)



【気仙沼海岸 千岩田地区海岸】 進捗状況

進捗状況

先月末の進捗状況は **21.0%** です。
完成は平成29年3月24日を予定しています。

① 平成27年11月末 現在の状況



現在、軟弱地盤の地盤改良工を進めております。

② 平成27年11月末 現在の状況



現在、軟弱地盤の地盤改良工を進めております。
