

【水戸辺川】 進捗状況

事業概要


【水戸辺川】復旧延長 L=2678.0m(左岸1330m右岸1357.0m)
 築堤盛土 V=154,000m³, A=64,543m²,天端被覆工A=17,090m²
 樋門・樋管工 N=7基
 【水戸辺川(上流部No.38付近)】復旧延長 L=18.0m(左岸18.0m)
 コンクリートブロック工 A=76m²

事業位置



水戸辺川
 本吉郡南三陸町戸倉字水戸辺

計画平面図

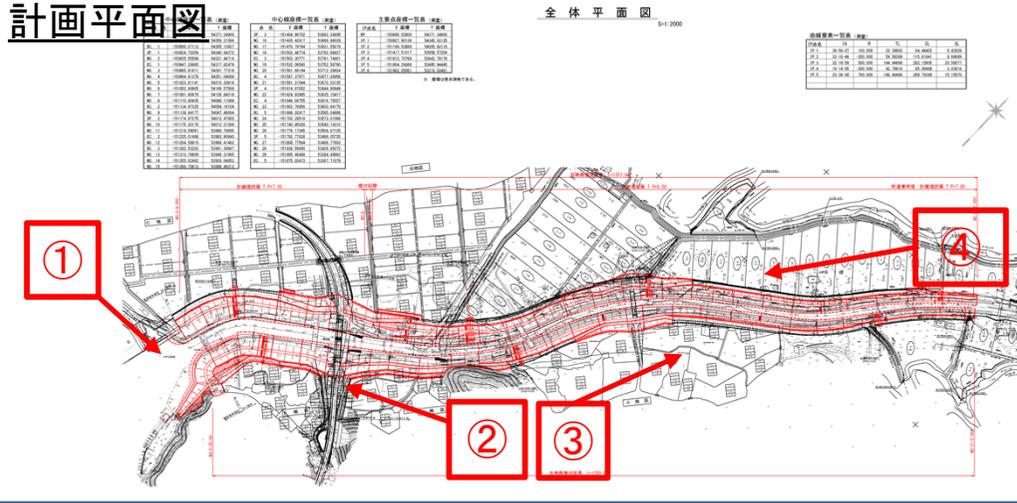


① 着手前 平成26年10月



② 着手前 平成26年10月



計画横断面図

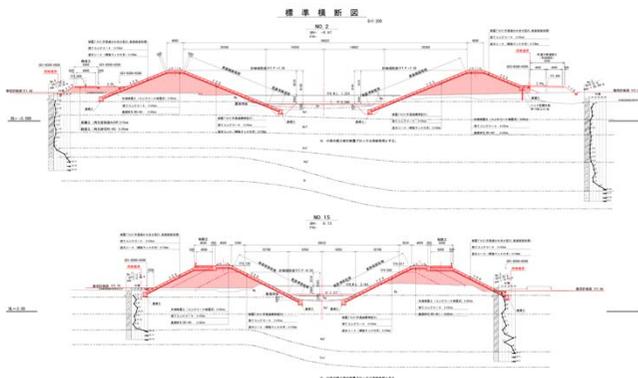

③ 着手前 平成26年10月



④ 着手前 平成26年10月



【水戸辺川】 進捗状況

進捗状況

現在、水門撤去及び海岸盛土を進めております。
完成は平成30年3月23日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



② 平成27年11月末現在の状況



③ 平成27年11月末現在の状況



④ 平成27年11月末現在の状況

