

【水尻川水系 水尻川】 進捗状況


事業概要

復旧延長 L=1,680 m 右岸L=840 m 左岸L=840 m


築堤盛土 V=31,270 m³

コンクリートブロック工 A=19,362 m²

計画平面図

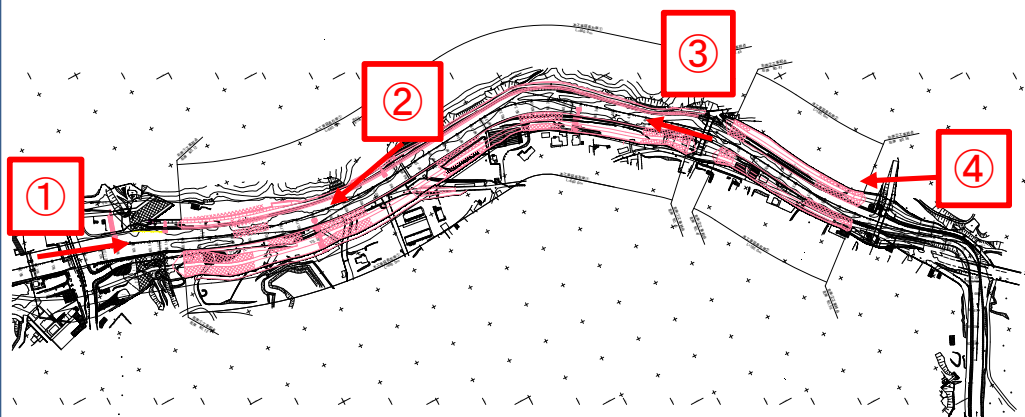

計画横断面図

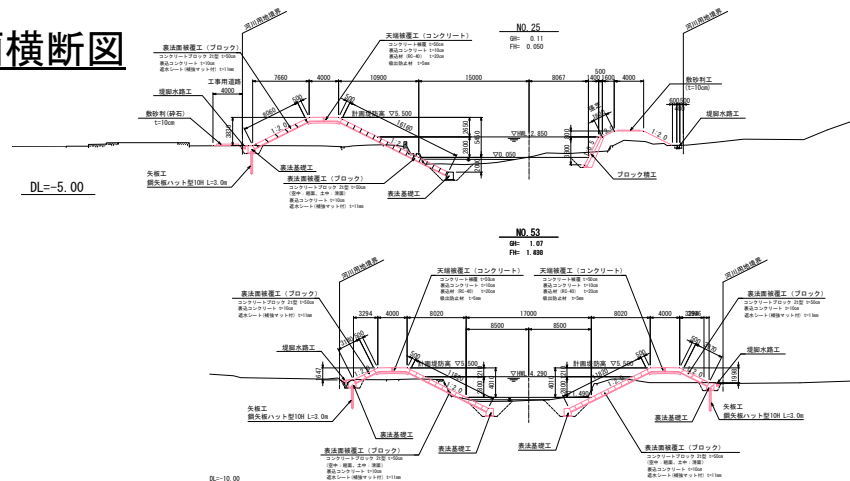

事業位置



水尻川

南三陸町志津川字竹川原地内

① 着手前 平成26年8月



② 着手前 平成26年8月



③ 着手前 平成26年8月



④ 着手前 平成26年8月



【水尻川水系 水尻川】 進捗状況

進捗状況

水門撤去工の内、二重締切と上流右岸側から法覆護岸工を進めております。写真⑥は最上流のかごマット復旧状況です。
完成は平成29年3月24日を予定しています。

⑤ 平成27年11月末現在の状況



【法覆護岸工】右岸上流側
築堤盛土部施工状況

⑥ 平成27年11月末現在の状況



【法覆護岸工】左岸上流側
コンクリートブロック施工状況。
