


【登米沢地区海岸】 進捗状況

事業概要


復旧延長 L=134.1m
 築堤盛土工 V=22,120m³ 法覆護岸工 A=5,400m²
 樋門工 N=1基 車道表層工 A=1,480m²

事業位置

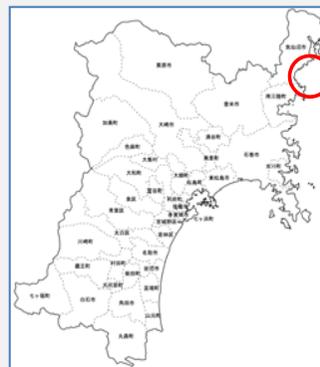

登米沢地区海岸

計画平面図

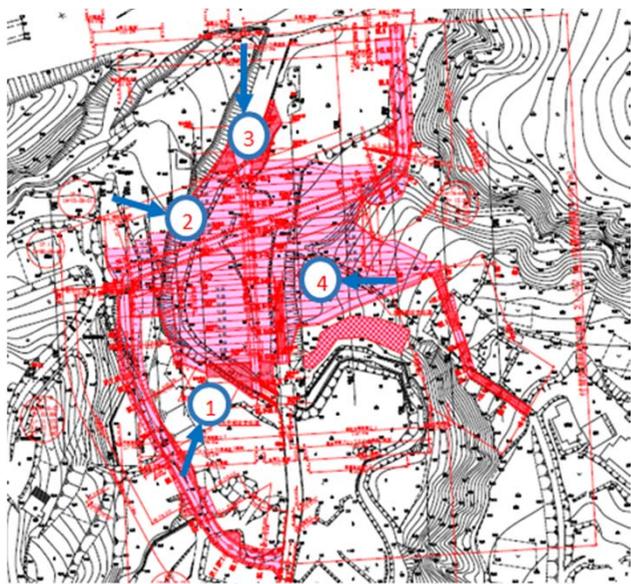

① 着手前 平成27年5月



② 着手前 平成27年5月




③ 着手前 平成27年5月



④ 着手前 平成27年5月



計画横断図

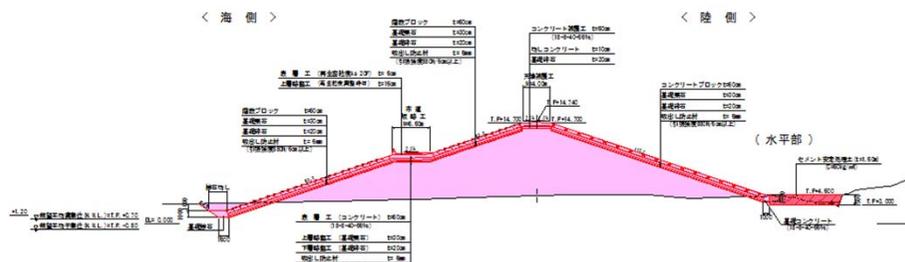

【登米沢地区海岸】 進捗状況

進捗状況

現在、築堤工を進めております。
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



② 平成27年11月末現在の状況



③ 平成27年11月末現在の状況



④ 平成27年11月末現在の状況

