

【稲淵川】 進捗状況


事業概要

復旧延長 L=156.0m (左岸154.8m、右岸156.0m)


コンクリートブロック積 L=148.6m

河口樋門 N=1基

計画立面図

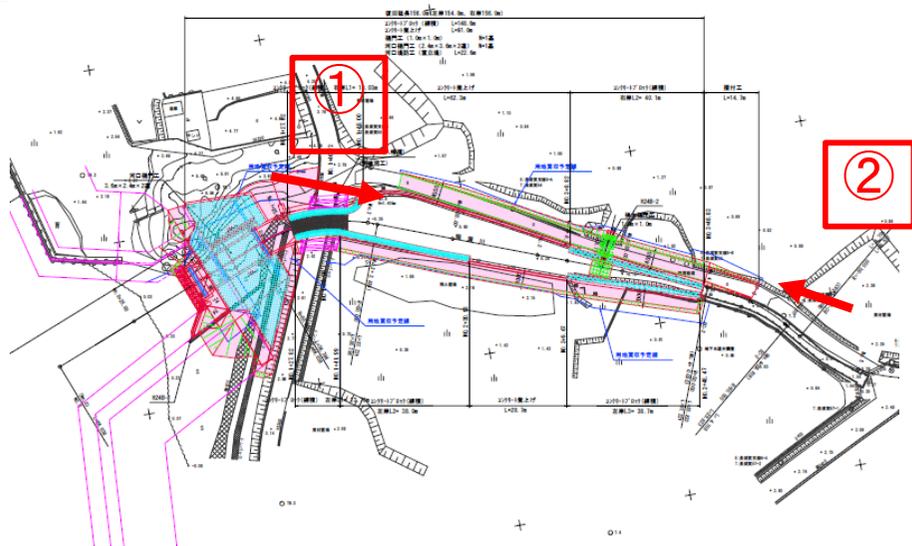

計画横断図



事業位置



稲淵川

本吉郡南三陸町歌津字長柴

① 着手前 平成26年4月



② 着手前 平成26年4月



【稲淵川】進捗状況

進捗状況

現在、本工事着手準備中です。
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



現在、
工事準備中です。

② 平成27年11月末現在の状況



現在、
工事準備中です。
