

【伊里前川】進捗状況

事業概要

【伊里前川】

伊里前川河川災害復旧工事(その1)

施工延長 L=902m


本工事	築堤盛土	V= 15,680m ³
	法覆護岸工	A= 5,785m ²
	矢板工	N= 1,984枚
付帯工事	伊里前樋管工	N= 3基

伊里前川河川災害復旧工事(その2)


施工延長 L=952m

本工事	築堤盛土	V=108,670m ³
	法覆護岸工	A= 21,388m ²
	矢板工	N= 1,980枚
付帯工事	伊里前樋管工	N= 2基

計画平面図

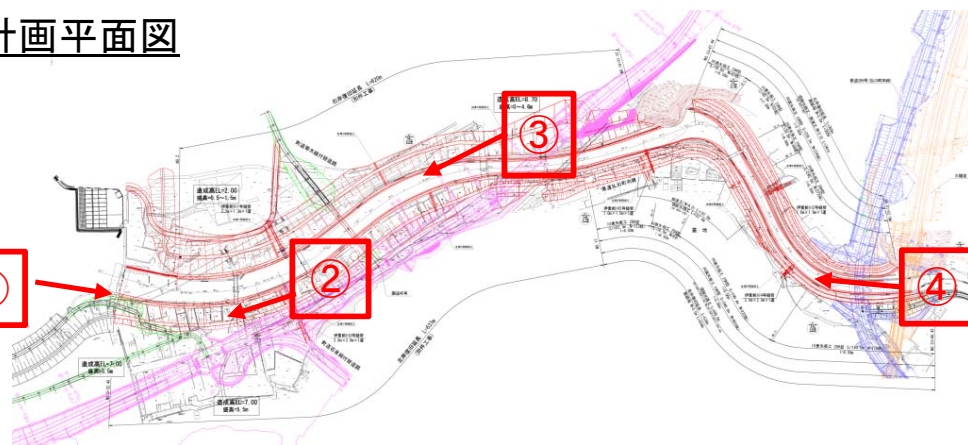

計画横断図

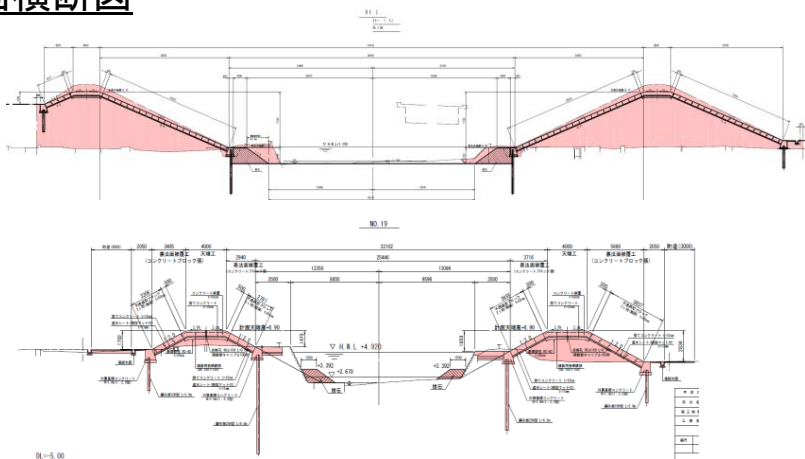

事業位置



伊里前川

本吉郡南三陸町歌津字伊里前

① 着手前 平成27年11月



② 着手前 平成27年11月



③ 着手前 平成27年11月



④ 着手前 平成27年11月

